

6^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

21 Οκτωβρίου 2022

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ

Αρεόπολη Λακωνίας

1. ΓΕΝΙΚΑ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΝΝΟΙΕΣ

Η εφαρμογή του Προγράμματος της περιόδου 2014 – 2020 έχει ως διαχειριστική έναρξη εφαρμογής του την θεσμοθετημένη στην Ελλάδα «εξειδίκευση» δράσεων του Προγράμματος, η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, προκειμένου να προετοιμασθούν και να εκδοθούν οι αντίστοιχες προσκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους, για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα σχετικών πράξεων / έργων.

Αυτές οι δύο (2) διαχειριστικές διαδικασίες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εντάσσονται στο στάδιο «Ενεργοποίησης» του Προγράμματος και αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος για την αποτελεσματική εφαρμογή του και την αξιοποίηση των πόρων του από τους δυνητικούς δικαιούχους προς επίτευξη των αναμενόμενων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα¹.

Στη συνέχεια και κατ' ακολουθία των προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους, έπεται η ένταξη πράξεων / έργων στο Πρόγραμμα για χρηματοδότηση από αυτό. Αυτή η διαχειριστική διαδικασία αποτελεί την τυπική έναρξη υλοποίησης (προοπτική υλοποίησης) του Προγράμματος, με δεδομένο ότι οι ενταγμένες πράξεις αποτελούν την Α' ύλη εφαρμογής και βασικό σημείο αναφοράς υλοποίησης του Προγράμματος. Την διαχειριστική διαδικασία ένταξης των πράξεων ακολουθεί η διαδικασία δημοπράτησης υποέργων των ενταγμένων στο Πρόγραμμα πράξεων και εν συνεχεία η συμβασιοποίηση τους, η οποία και αποτελεί την ουσιαστική έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος. Αυτή (η συμβασιοποίηση) καθορίζει την νομική δέσμευση των πόρων του Προγράμματος, προσδιορίζοντας παράλληλα και την χρονική υλοποίησή του, με βάση την διάρκεια εκτέλεσης κάθε σύμβασης.

Κατόπιν και της συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων των ενταγμένων πράξεων, η εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, αλλά και των υπολοίπων συνοδών υποέργων που συνθέτουν κάθε πράξη, πραγματοποιείται η εφαρμογή του Προγράμματος με την δημιουργία των αντίστοιχων και των ανάλογων της εξέλιξης εκτέλεσης των συμβάσεων, επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών.

Με βάση τις προαναφερόμενες διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες προσδιοριζόμενες από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, το οποίο έχει ενσωματώσει το αντίστοιχο ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, προκύπτουν τα επίπεδα εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 και η προοπτική ολοκλήρωσής του μέχρι την λήξη της περιόδου 2014 – 2020 ως προς την επιλεξιμότητα των

¹ Με την πάροδο των ετών εφαρμογής του Προγράμματος και με την παράλληλη κάλυψη, σε υψηλό βαθμό, του Προγράμματος με ενταγμένες πράξεις, αμβλύνεται σημαντικά η σημασία παρακολούθησης των εξειδικεύσεων και των προσκλήσεων.

συγχρηματοδοτούμενων δαπανών και την ολοκλήρωση και την λειτουργικότητα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με δεδομένο ότι έχουν παρέλθει περισσότερα από επτά (7) έτη Εφαρμογής του Προγράμματος, κατόπιν της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και ήδη το Πρόγραμμα εμφανίζει ενταγμένες πράξεις προϋπολογισμού κατά 120% μεγαλύτερου του προϋπολογισμού του (154% στο ΕΤΠΑ και 47% στο ΕΚΤ) δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ο σχολιασμός επί των εξειδικεύσεων και επί των προσκλήσεων και μάλιστα ένα περίπου έτος (14-15 μήνες) πριν την λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών για την περίοδο 2014 – 2020. Μεγαλύτερη σημασία έχει η ορθολογική διαχείριση της υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του Προγράμματος από ενταγμένες πράξεις, αλλά και από συμβάσεις για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του Προγράμματος, χωρίς μεγάλη επιβάρυνσή των αμιγώς εθνικών πόρων. Τούτων δοθέντων, ο συνοπτικός σχολιασμός επί των επιπέδων εφαρμογής του Προγράμματος, ανά Ταμείο και ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται επί των ενταγμένων πράξεων, επί των συμβάσεων και επί των δαπανών.²

2.1 ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

Όσον αφορά στο μέρος του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το **ΕΤΠΑ**, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων φθάνει στα 441,33 εκατ. €, όταν ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 173,88 εκατ. €, ήτοι υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού του κατά 154%.

Αυτή η μεγάλη υπέρβαση οφείλεται σε αντίστοιχες υπερβάσεις των προϋπολογισμών όλων των Αξόνων Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην εκείνων της Τεχνικής Βοήθειας), για διαφορετικούς λόγους στον κάθε Άξονα Προτεραιότητας και ως εκ τούτου με σχετικά διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης ανά Άξονα Προτεραιότητας αυτών των υπερβάσεων, όπως θα παρουσιασθεί στη συνέχεια.

Αντίστοιχα, το συμβατικό τίμημα των υπογεγραμμένων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ φθάνει στα 318,55 εκατ. €, με υπερδέσμευση του αντίστοιχου προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά 83,2%. Αντίστοιχη, αλλά όχι ανάλογη υπερδέσμευση εμφανίζουν όλοι οι κύριοι Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην εκείνων της Τεχνικής Βοήθειας), με μεγάλες υπερδεσμεύσεις (της τάξης του 100%) σε συμβάσεις οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2B και 3, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι στον Άξονα Προτεραιότητας 1 οι συμβάσεις σχεδόν συμπίπτουν με τις εντάξεις, λόγω της διαχειριστικής ιδιαιτερότητας των Κρατικών Ενισχύσεων, οι οποίες κυριαρχούν στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και ταυτίζεται το συμβατικό αντικείμενο με τον προϋπολογισμό ένταξης.

² Οι σχετικοί πίνακες παρουσιάζουν σε μεγάλη ανάλυση όλα τα στάδια εφαρμογής του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των εξειδικεύσεων και των προσκλήσεων) για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος.

Τέλος, όσον αφορά στις δαπάνες των δικαιούχων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ανέρχονται σε 144,52 εκατ. €, το 83,1% του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

Σημείωση

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στον προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων / έργων και στο συμβατικό τίμημα των συμβασιοποιημένων πράξεων / υποέργων περιλαμβάνονται και εκείνες οι πράξεις / έργα που δεν θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος, ως ωριμάζουσες στο Πρόγραμμα 2014 – 2020 και θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους / ολοκλήρωσή τους την περίοδο 2021 – 2027 («μεταφερόμενα» και phasing), ενώ στις δαπάνες του Προγράμματος 2014 – 2020 δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές αυτών των έργων / πράξεων.

Όσον αφορά στο μέρος του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το **ΕΚΤ**, του οποίου το 98,2% δεσμεύεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2Α³, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 118,88 εκατ. €, με υπέρβαση του αντίστοιχου προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά 47%. Σημειωτέον δε, ότι η συμμετοχή του ΕΚΤ στον συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος, είναι σχετικά υψηλή, της τάξης του 32%.

Το συμβατικό τίμημα των υπογεγραμμένων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ φθάνει στα 103,1 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό ΕΚΤ του Προγράμματος κατά 27,2% λαμβάνοντας υπ' όψη ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συμβάσεων είναι εγκεκριμένες αυτεπιστασίες των δικαιούχων («υλοποίηση με ίδια μέσα»).

Τέλος, οι δαπάνες (πληρωμές των δικαιούχων), ανέρχονται σε 53,03 εκατ. €, το 65,5% του αντίστοιχου προϋπολογισμού ΕΚΤ του Προγράμματος.

Σημείωση

Όπως και στις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, στον μεν προϋπολογισμό ενταγμένων πράξεων, και στο συμβατικό τίμημα που αναφέρεται πιο πάνω περιλαμβάνονται και πράξεις / έργα που ωριμάζουν στο Πρόγραμμα 2014 – 2020 και θα υλοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2021 – 2027 («μεταφερόμενα» ή / και συνεχιζόμενα), ενώ στις δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές αυτών των έργων / πράξεων.

2.2 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2.2.1 ΑΠ 1 (Έρευνα, καινοτομία, ψηφιακά και επιχειρηματικότητα)

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 48.000.000 € δεσμεύοντας το 27,6% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

³ Το υπόλοιπο 1,8% καλύπτεται από τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια», πολύ μικρού προϋπολογισμού, ύψους 1,45 εκατ. €.

Οι 2.388 ενταγμένες σ' αυτόν πράξεις, κατά κύριο λόγο κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, κατά βάση στο Θεματικό Στόχο 3, έχουν προϋπολογισμό 98,08 εκατ. €, ο οποίος υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας κατά 104%.

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις, από 2.387 πράξεις, λαμβάνοντας υπ' όψη την ιδιαιτερότητα διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων στις οποίες ταυτίζεται χρονικά και ποσοτικά ο προϋπολογισμός ένταξης με το συμβατικό αντικείμενο, έχουν συμβατικό τίμημα 96,70 εκατ. €, υπερδεσμεύοντας τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας κατά 101%.

Οι δαπάνες που εμφανίζονται στον Άξονα Προτεραιότητας είναι 48,18 εκατ. € υπερκαλύπτοντας κατά τι (0,37%) του προϋπολογισμού του.

Σημείωση

Βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προς επιλογή και ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας μια πράξη προϋπολογισμού της τάξης των 3,0 εκατ. €, η οποία αφού ωριμάσει διοικητικά και τεχνικά θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας.

2.2.2 ΑΠ 2Α (Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνική ένταξη)

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2Α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 79.572.690€ και όπως έχει ήδη αναφερθεί δεσμεύει το 98,2% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του Προγράμματος και ως εκ τούτου καθορίζει απόλυτα τα επίπεδα εφαρμογής του ΕΚΤ στο Πρόγραμμα.

Οι 408 πράξεις που έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας έχουν προϋπολογισμό 117,85 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό του κατά 48,1%, με ιδιαίτερη συγκέντρωση (83,6%) του πλήθους των ενταγμένων πράξεων (ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii του Θεματικού Στόχου 8, αλλά με ιδιαίτερη συγκέντρωση (77,00%) του προϋπολογισμού ενταγμένων πράξεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i και 9iv του Θεματικού Στόχου 9 (εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας αντίστοιχα). Μια Επενδυτική Προτεραιότητα (9v: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) πολύ μικρού ενδεικτικού προϋπολογισμού (500 χιλ. €) παραμένει ανενεργή και ως προς τις προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους.

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στο πλαίσιο του ΑΠ2Α, έχουν συμβατικό τίμημα 102,27 εκατ. €, λαμβάνοντας υπ' όψη τις διαχειριστικές ιδιαιτερότητες των κρατικών ενισχύσεων (επενδυτική προτεραιότητα 9iii), και των αυτεπιστασιών (υλοποίηση με ίδια μέσα) των περισσότερων πράξεων του Θεματικού Στόχου 9. Το προαναφερόμενο συμβατικό τίμημα δημιουργεί υπερδέσμευση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α κατά 28,5%.

Οι δαπάνες που εμφανίζονται στον ΑΠ1 ανέρχονται σε 50,15 εκατ. € και καλύπτουν το 63,03% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Το 80,6% αυτών των δαπανών προέρχονται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i και 9iv, ενώ δεν έχει εμφανίσει ακόμη δαπάνες η Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii, λόγω της σχετικά πρόσφατης ένταξης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων (ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση).

Υστερήσεις δαπανών έναντι των συμβάσεων (αυτεπιστασιών) επίσης εμφανίζονται στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9ii,9iii, και 9vi, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε Επενδυτική Προτεραιότητα.

Σημειωτέον δε ότι, βρίσκονται υπό αξιολόγηση προς επιλογή και ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας τρεις (3) προτάσεις χρηματοδότησης. Η μία (1) αφορά σε κατάρτιση εργαζομένων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8v του Θεματικού Στόχου 8, εκτιμώμενου προϋπολογισμού της τάξης των 4,0 εκατ. €, η δεύτερη αφορά σε κατάρτιση και πρακτική άσκηση ανέργων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού της τάξης των 5,0 εκατ. € και η Τρίτη αφορά σε δράσεις προληπτικής ιατρικής στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού της τάξης του 1,0 εκατ. €.

Εφ' όσον ενταχθούν αυτές οι τρεις (3) πράξεις εντός του μήνα Οκτωβρίου όπως εκτιμάται, τότε τα επίπεδα εντάξεων και συμβάσεων του ΑΠ2Α θα αυξηθούν κατά 10- 12 ποσοστιαίες μονάδες ως προς τον προϋπολογισμό του.

2.2.3 ΑΠ 2B (Κοινωνικές Υποδομές)

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας, συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΤΠΑ, έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 20.700.000 € και είναι ο μικρότερος σε προϋπολογισμό κύριος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος, εκτός των δύο (2) Αξόνων Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.

Στον Άξονα Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 52 πράξεις προϋπολογισμού 62,34εκατ. €, ποσό που υπερβαίνει κατά 101% τον προϋπολογισμό του. Το μεγαλύτερο πλήθος των ενταγμένων πράξεων (40 στον αριθμό) αφορούν στον Θεματικό Στόχο 9 (κυρίως υποδομές υγείας και πρόνοιας), με το 57% του προϋπολογισμού ενταγμένων πράξεων στον ΑΠ2B και οι υπόλοιπες ενταγμένες πράξεις είναι στον Θεματικό Στόχο 10 (υποδομές εκπαίδευσης).

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις προέρχονται από 43 πράξεις και έχουν συμβατικό τίμημα 41,14 εκατ. €, υπερδεσμεύοντας τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας κατά 99%.

Οι δαπάνες στον ΑΠ2B προέρχονται από 29 συμβασιοποιημένες πράξεις / έργα και φθάνουν στα 14,96 εκατ. €, καλύπτοντας το 71,29% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, με το 55% των δαπανών να προέρχονται από το Θεματικό Στόχο 10.

2.2.4 ΑΠ 3 (Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, τουρισμός, πολιτισμός)

Ο ΑΠ3, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 47.800.000€.

Στον Άξονα Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 107 πράξεις / έργα προϋπολογισμού 133,44 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό του κατά 179%. Η συντριπτική πλειονότητα των ενταγμένων πράξεων (το 88%) είναι στον Θεματικό Στόχο 6, οι οποίες καλύπτουν το 69% του προϋπολογισμού του συνόλου των ενταγμένων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας και αφορούν κατά κύριο λόγο σε πράξεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και επενδύσεις για την διαχείριση του πόσιμου νερού.

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις, με συμβατικό τίμημα 101,59 εκατ. € προέρχονται από 89 ενταγμένες πράξεις και υπερβαίνουν κατά 112,5% τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας, με συγκέντρωση τόσο του αριθμού των συμβάσεων, όσο και του συμβατικού τιμήματος στο Θεματικό Στόχο 6 και συγκεκριμένα στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 6b και 6c αντίστοιχα στη διαχείριση πόσιμου νερού και στην προετοιμασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τις παραπάνω υπογεγραμμένες συμβάσεις των 89 πράξεων, δαπάνες εμφανίζουν οι συμβάσεις 47 πράξεων με ποσό 24,91 εκατ. €, καλύπτοντας το 52,12% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Το σχετικά χαμηλό επίπεδο δαπανών που εμφανίζει ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας οφείλεται στους εξής τρεις (3) παράγοντες:

- α) Σημαντικός αριθμός πράξεων / έργων παρουσίασε καθυστερήσεις στην επιλογή τους και ένταξής τους στο Πρόγραμμα (κυρίως οι πράξεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς) λόγω των αναγκαίων διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού και ως εκ τούτου καθυστέρηση στη συμβασιοποίησή τους (έγκρισης των αντίστοιχων αυτεπιστασιών).
- β) Στη μη καταχώρηση δαπανών που δημιουργούν οι πράξεις / έργα τα οποία εντάχθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος 2014 – 2020 προκειμένου να ωριμάσουν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα της περιόδου 2021 – 2027.
- γ) Ένας σημαντικός αριθμός (36) πράξεων / έργων προϋπολογισμού 18,05 εκατ. € είναι έργα των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης, οι οποίες παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους, δεδομένης και της σχετικής καθυστέρησης έγκρισής τους και έναρξη της εφαρμογής τους, λόγω των αναγκαίων διαδικασιών σχεδιασμού και έγκρισής τους.

Με δεδομένο όμως ότι το μεγαλύτερο πλήθος όλων των παραπάνω πράξεων / έργων είναι σχετικά μικρού προϋπολογισμού, με μικρή διάρκεια εκτέλεσής τους, στο επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών, θα εμφανίσουν τις αναμενόμενες από τις συμβάσεις τους δαπάνες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος.

2.2.5 ΑΠ 4 (Μεταφορικές υποδομές / δίκτυα)

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 52.966.533€.

Έχουν ενταχθεί 14 πράξεις / έργα προϋπολογισμού 142,7 εκατ. €, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας κατά 169%.

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις, σε 11 πράξεις / έργα έχουν επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση συμβατικό τίμημα 74,61 εκατ. €, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας κατά 40,9%.

Οι δαπάνες του ΑΠ4 φθάνουν στα 47,80 εκατ. €, καλύπτοντας το 90,25% του προϋπολογισμού του.

Επιπρόσθετα προς τα παραπάνω επίπεδα εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4, βρίσκονται υπό αξιολόγηση προς επιλογή και ένταξη στο Πρόγραμμα τρεις (3) προτεινόμενες προς χρηματοδότηση πράξεις, οι εξής:

- α) Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής και των αντίστοιχων σταθμών της διαδρομής Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 12,00 εκατ. €.
- β) Βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020», εκτιμώμενου προϋπολογισμού της τάξης των 2,00 εκατ. €.
- γ) Δημιουργία / κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 6,0 εκατ. €.

2.2.6 ΑΠ 5 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ)

Ο ΑΠ6 είναι πολύ μικρού προϋπολογισμού 4.417/840 €, δημόσιας δαπάνης, αντιπροσωπεύοντας το 2,54% του αντίστοιχου συνολικού προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

Έχουν ενταχθεί 17 πράξεις προϋπολογισμού 4,77 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό του κατά 8%. Τόσο οι πράξεις / έργα του Άξονα Προτεραιότητας, όσο και τα υποέργα που συνθέτουν κάθε ενταγμένη πράξη είναι μικρού προϋπολογισμού, ιδιαίτερα των υποέργων με μικρή διάρκεια εκτέλεσής τους.

Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις προέρχονται και από τις 17 ενταγμένες πράξεις και έχουν συμβατικό τίμημα 4,51 εκατ. €, ποσό που υπερδεσμεύει τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας κατά 2%.

Οι δαπάνες που εμφανίζονται στον Άξονα προτεραιότητας προέρχονται και από τις 17 πράξεις και φθάνουν στα 3,98 εκατ. €, καλύπτοντας το 90,06% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

Με δεδομένες τις ανάγκες διαχείρισης του Προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωσή του και ιδιαίτερα για τις ενέργειες / διαδικασίες διαχειριστικού κλεισίματος των πράξεων, αλλά και την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος, ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτούμενος από το επικεφαλής Ταμείο (ΕΤΠΑ) θα υπερβεί, σε ορθολογικό πλαίσιο και σύμφωνα με τους κανονισμούς, τον προϋπολογισμό του.

2.2.7 ΑΠ 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ)

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας έχει ιδιαίτερα μικρό προϋπολογισμό, μόλις 1.448.249 € (το 1,79% του προϋπολογισμού ΕΚΤ στο Πρόγραμμα).

Παρά τον πολύ μικρό προϋπολογισμό του, τα επίπεδα εφαρμογής του είναι επίσης πολύ μικρά. Αυτό, εν πολλοίς, οφείλεται στη φύση των δράσεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, την εφαρμογή των οποίων καλείται να υποστηρίξει ο ΑΠ7 και στον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι περισσότερες και μάλιστα εκείνες με μεγάλους προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα, αυτές οι δράσεις, που καλύπτουν σχεδόν το 90% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του Προγράμματος, με δικαιούχους κεντρικούς φορείς, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οριζόντια στο σύνολο της Χώρας.

Ως εκ τούτου, τα περιθώρια υποστήριξης της εφαρμογής του Προγράμματος, δηλαδή του ΑΠ2Α, για την επιτάχυνση της είναι πολύ περιορισμένα.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ενταγμένες πράξεις στον Άξονα Προτεραιότητας 7 είναι οκτώ (8), με προϋπολογισμό 1,02 εκατ. € (το 70,7% του προϋπολογισμού του). Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις προέρχονται από επτά (7) ενταγμένες πράξεις και έχουν συμβατικό τίμημα 826,8 χιλ. € (το 57,1% του προϋπολογισμού του ΑΠ7).

Όσον αφορά στις δαπάνες που εμφανίζονται στον ΑΠ7 προέρχονται και από τις επτά (7) συμβασιοποιημένες κατά ένα μέρος τους πράξεις και ανέρχονται σε 791,39 χιλ. € (το 54,64% του προϋπολογισμού του ΑΠ7).

3 ΚΑΝΟΝΑΣ N+3

Όπως φαίνεται από τα αναλυτικά στοιχεία του συνημμένου Πίνακα 4, με βάση τις πιστοποιημένες δαπάνες (δηλαδή αυτές που έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες αιτήσεις πληρωμής προς την Επιτροπή), μέχρι 30/09/2022, οι ανάγκες κάλυψης του Κανόνα N+3 έχουν ήδη υπερκαλυφθεί κατά 37,76 εκατ. € σε δημόσια δαπάνη και κατά 30,2 εκατ. € σε ενωσιακή συνδρομή.

4 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ / ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η πρόοδος επίτευξης των δεικτών του πλαισίου επίδοσης διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων των Αξόνων Προτεραιότητας ανά στάδιο / φάση εφαρμογής, ιδιαίτερα δε με τα στάδια των εντάξεων, των συμβάσεων και των δαπανών.

Πιο συγκεκριμένα ανά Άξονα Προτεραιότητας, η εικόνα ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων του πλαισίου επίδοσης και την επιτευξιμότητά τους μέχρι το τέλος της περιόδου 2014 – 2020, παρουσιάζεται αμέσως πιο κάτω.

4.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

Στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ1 συμμετέχουν τρεις (3) δείκτες, ένας κοινός δείκτης εκρών (CO02), ένας Βασικού Σταδίου Υλοποίησης (αριθμός συμβάσεων) και ο χρηματοοικονομικός (F100), που αναφέρεται σε πιστοποιημένες δαπάνες. Ο κοινός δείκτης εκρών συνδέεται με το 95% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα 5, ο στόχος του δείκτη εκρών CO02, έχει ήδη επιτευχθεί από το τέλος του έτους 2021, σε ποσοστό 97,1%, ενώ με βάση τα ενταγμένα έργα που προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του ΕΠ, το ποσοστό επίτευξης του στόχου του δείκτη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 125%.

Όσον αφορά στον οικονομικό δείκτη F100 «ποσό πιστοποιημένων δαπανών», σύμφωνα με τα στοιχεία των πιστοποιημένων δαπανών στο τέλος του έτους 2021, η επίτευξη του στόχου του δείκτη αναλογούσε στο 60% περίπου του στόχου του για το τέλος του 2023, ενώ με βάση τις δαπάνες των υλοποιούμενων έργων στις 30/9/2022, το εν λόγω ποσοστό έχει ανέλθει στο 100% του στόχου του δείκτη.

Ως εκ τούτου, όσον αφορά στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ1, το σύνολο των στόχων των δεικτών του έχουν ήδη επιτευχθεί.

4.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α

Το Πλαίσιο Επίδοσης του εν λόγω ΑΠ, περιλαμβάνει πέντε (5) δείκτες εκροών, καθώς επίσης και τον οικονομικό δείκτη F100.

Με βάση τα στοιχεία, τα οποία έχουν αποτυπωθεί στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2021, οι στόχοι του συνόλου των δεικτών εκροών, του ΑΠ2Α, είχαν επιτευχθεί σε ποσοστό άνω του 85%, ενώ σε τρεις εκ των συνολικά πέντε δεικτών εκροών, οι επιτευχθείσες τιμές έχουν υπερβεί τους στόχους των δεικτών στο πλαίσιο επίδοσης. Ως εκ τούτου και με βάση τους στόχους των ενταγμένων έργων στις 30/9/2022, τα οποία προβλέπεται ότι θα συμμετέχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά και στον συνημμένο πίνακα 5, όλοι οι στόχοι των δεικτών εκροών του Πλαισίου Επίδοσης φαίνεται ότι υπερκαλύπτονται σημαντικά.

Ο μοναδικός δείκτης του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ2Α, που εμφανίζει χαμηλό ποσοστό επίτευξης, είναι ο οικονομικός δείκτης F100, του οποίου η επίτευξη στο τέλος του έτους 2021 ανήλθε σε 46,3%, ενώ με βάση τις δαπάνες του ΑΠ2Α στις 30/9/2022, το εν λόγω ποσοστό επίτευξης αναλογεί στο 56,6% του στόχου του δείκτη για το τέλος του έτους 2023. Αυτή η απόκλιση, προβλέπεται ότι θα υπερκαλυφθεί εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος έως το τέλος του έτους 2023, με βάση τον προγραμματισμό της ΕΥΔ και της εκτίμησης ολοκλήρωσης του ΑΠ2Α, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ειδικότερες ενέργειες που έχουν ληφθεί και συνεχίζονται να λαμβάνονται, για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του ΑΠ.

4.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Β

Στο πλαίσιο Επίδοσης του εν λόγω ΑΠ, περιλαμβάνονται δύο (2) δείκτες εκροών (CO35 και CO36) και ο οικονομικός δείκτης F100.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα 5, στο τέλος του έτους 2021, οι στόχοι των δεικτών εκροών δεν είχαν επιτευχθεί. Ωστόσο, με βάση τους στόχους των ενταγμένων έργων που προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος, οι εν λόγω στόχοι των δεικτών εκροών εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν με ασφάλεια, κυρίως λόγω και του σημαντικού αριθμού ενταγμένων και υλοποιούμενων έργων στον ΑΠ2Β.

Όσον αφορά στον οικονομικό δείκτη F100 «ποσό πιστοποιημένων δαπανών», σύμφωνα με τα στοιχεία των πιστοποιημένων δαπανών στο τέλος του έτους 2021, η επίτευξη του στόχου του δείκτη ήταν 65% περίπου, ενώ με βάση τις δαπάνες των υλοποιούμενων έργων μέχρι τις 30/9/2022, το εν λόγω ποσοστό έχει ανέλθει στο 71,7% του στόχου του δείκτη. Με βάση τα στοιχεία αυτά, καθώς και λαμβάνοντας υπ' όψη τα όσα αναφέρθηκαν περί του σημαντικού αριθμού υλοποιούμενων έργων και βάσει τις εκτιμήσεις ολοκλήρωσης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι και ο στόχος του δείκτη F100, στο τέλος του έτους 2023, θα έχει υπερκαλυφθεί.

4.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

Στο πλαίσιο επίδοσης του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας συμμετέχουν τρεις (3) δείκτες, δύο κοινοί εκροών (CO09 & CO18) και ο χρηματοοικονομικός δείκτης F100.

Αμφότεροι οι δείκτες εκροών που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επίδοσης δεν παρουσιάζουν προβλήματα επίτευξης των στόχων τους, παρά τα χαμηλά ποσοστά επίτευξής τους στο τέλος του έτους 2021, όπως φαίνεται και στον συνημμένο πίνακα 5.

Βασικός λόγος της εν λόγω ασφαλούς εκτίμησης για την επίτευξη των στόχων των εν λόγω δεικτών είναι ο σημαντικός αριθμός υλοποιούμενων έργων, τα οποία δύναται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους 2023. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα 5, οι στόχοι των ενταγμένων έργων που προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο, εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων / των δεικτών εκροών του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ3.

Ομοίως, όπως αναφέρθηκε και για τον ΑΠ2Β, λαμβάνοντας υπ' όψη τα όσα αναφέρθηκαν περί της δυνατότητας ολοκλήρωσης σημαντικού αριθμού υλοποιούμενων έργων εντός της περιόδου 2014 – 2020, εκτιμάται ότι και ο στόχος του δείκτη F100, στο τέλος του έτους 2023, θα έχει υπερκαλυφθεί, όπως φαίνεται και στο μέρος των εγγράφων που αναφέρεται στις προοπτικές ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

4.5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

Στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ συμμετέχουν τρεις (3) δείκτες, ήτοι δύο (2) κοινοί δείκτες εκροών (CO13 & CO14) και ο χρηματοοικονομικός δείκτης F100.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα 5, τόσο ο δείκτης εκροών CO13, όσο και ο χρηματοοικονομικός δείκτης F100, παρουσίασαν επίτευξη στο τέλος του 2021, άνω του 85%, ενώ με βάση τα στοιχεία των ενταγμένων έργων που θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του ΕΠ, οι εν λόγω στόχοι των δεικτών φαίνεται ότι θα έχουν υπερκαλυφθεί.

Ζήτημα εμφανίζεται ωστόσο, για τον δείκτη εκροών CO14, του οποίου ο στόχος στο τέλος του έτους 2021 είχε καλυφθεί σε ποσοστό 33,4%, ενώ με βάση τον στόχο των ενταγμένων έργων που προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του ΕΠ, η επίτευξή του δεν υπερβαίνει το 65%. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι τρία έργα προγραμματίζονται να αποτελέσουν έργα phasing, με τον συνολικό στόχο τους να υπερβαίνει τον στόχο του δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης. Ως εκ τούτου ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη θα καλυφθεί την περίοδο 2021 – 2027, όπως κανονιστικά προβλέπεται για τα τμηματοποιημένα έργα σε δύο (2) περιόδους. Συνεπώς και με τα όσα αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των Προγραμμάτων, για την συγκεκριμένη περίπτωση δύναται να υπάρξει αντίστοιχη αναθεώρηση του Προγράμματος για την τροποποίηση του στόχου του δείκτη έως τον 9ο/2023.

5 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020

Με βάση τα επίπεδα εφαρμογής του Προγράμματος που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα, καθώς και σύμφωνα με την διαχρονική εξέλιξη της εφαρμογής του σε όλα τα διακριτά μέρη του (Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες), λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πλήρους συμβασιοποίησης των ενταγμένων πράξεων, αλλά και εκείνων προς άμεση ένταξη και την εξέλιξη εκτέλεσης των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων, οι προοπτικές οικονομικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος τόσο και στο σύνολο του, όσο και σε επίπεδο Ταμείων και Άξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 1 και παραστατικά στα διαγράμματα 1, 1.1 – 1.7 και 2.1 – 2.3.

Για την εκτίμηση των προοπτικών ολοκλήρωσης του Προγράμματος μέχρι την λήξη της περιόδου 2014 – 2020 ελήφθησαν επίσης υπόψη τα έργα / πράξεις που ωριμάζουν στο Πρόγραμμα 2014 – 2020 και θα χρηματοδοτηθούν εξ' ολοκλήρου ή κατά ένα τμήμα τους την περίοδο 2021 – 2027, είτε ως «μεταφερόμενα», είτε ως phasing, είτε ως «συνεχιζόμενα» εκείνα του ΕΚΤ. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη οι επικείμενες τροποποιήσεις των Κανονισμών της περιόδου 2014 – 2020 και 2021 – 2027 ως προς τα τμηματοποιημένα έργα μεταξύ των δύο (2) περιόδων, καθώς και τα όρια υπέρβασης των δαπανών σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και συνολικού Προγράμματος.

5.1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις από ενταγμένες πράξεις στο Πρόγραμμα και τις αναμενόμενες από ενταγμένα ή από προς ένταξη έργα / πράξεις, υπολογίζεται ότι έργα / πράξεις με συμβατικό τίμημα, μέχρι το τέλος του έτους 2023, περίπου 158,5 εκατ. € θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου⁴.

Ως εκ τούτου, οι δαπάνες των έργων / πράξεων που θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος 2014 – 2020 θα φθάσουν στα 285,7 εκατ. €. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος κατά 12% περίπου.

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το **ΕΤΠΑ**, από το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων που θα προκύψουν αθροιστικά από τις νέες συμβάσεις, μέχρι το τέλος του έτους 2023 και τις υφιστάμενες, έργα / πράξεις με συμβατικό τίμημα της τάξης των 144 εκατ. € θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ως εκ τούτων, οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ

⁴ Μέρος του συμβατικού τιμήματος ορισμένων συμβάσεων θα χρηματοδοτηθεί από αμιγώς εθνικούς πόρους κατά τα έτη 2024 – 2025, ενώ ορισμένες συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα δημιουργήσουν δαπάνες μικρότερες του συμβατικού τιμήματος και οι συγκεκριμένες πράξεις θα κλείσουν σ' αυτό το μικρότερο ποσό δαπανών.

δαπάνες των έργων / πράξεων που θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος, εκτιμώνται σε περίπου 200 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο προϋπολογισμό ΕΤΠΑ του Προγράμματος κατά 15% περίπου.

Για το μέρος του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το **ΕΚΤ**, από το σύνολο των συμβάσεων που θα προκύψουν αθροιστικά μέχρι το τέλος του έτους 2023 και τις υφιστάμενες, έργα / πράξεις, με συμβατικό τίμημα της τάξης των 15,0 εκατ. €, θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ ορισμένες από αυτές τις συμβάσεις, κυρίως από τις υφιστάμενες εκτιμάται ότι θα «κλείσουν» το 2023 σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα δαπανών (κυρίως οι συμβάσεις των ΤΟΜΥ και οι προσλήψεις για την αντιμετώπιση των αναγκών στις υγειονομικές μονάδες λόγω covid-19).

Ως εκ τούτων, οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ δαπάνες των έργων / πράξεων που θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος εκτιμώνται σε περίπου 85,00 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο προϋπολογισμό ΕΚΤ του Προγράμματος κατά 5% περίπου.

5.2 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

5.2.1 ΑΠ 1 (Έρευνα, καινοτομία, ψηφιακά και επιχειρηματικότητα)

Με βάση τις υφιστάμενες συμβάσεις στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπ' όψη την ιδιαιτερότητα των κρατικών ενισχύσεων στις οποίες ο προϋπολογισμός ένταξης ταυτίζεται με το συμβατικό αντικείμενο και από την εμπειρία όλων των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ότι ένα ποσοστό της τάξης του 40% - 60% των δικαιούχων επιχειρήσεων δεν υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο⁵, εκτιμάται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 1 θα κλείσει με επιλέξιμες δαπάνες περίπου 57,5 εκατ. €. Αυτό το ποσό είναι υψηλότερο κατά 120% περίπου από τον προϋπολογισμό του.

Παράλληλα, ορισμένες πράξεις, κυρίως κρατικές ενισχύσεις, αλλά και μία (1) πράξη υπό ένταξη μη κρατική ενίσχυση, οι οποίες ωριμάζουν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 και θα είναι επιλέξιμες για την νέα περίοδο 2021 – 2027, θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συμβατικό αντικείμενο της τάξης των 20,00 εκατ. €.

5.2.2 ΑΠ 2Α (Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνική ένταξη)

Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας, όπως έχει προαναφερθεί, δεσμεύει το 98,2% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του Προγράμματος, όσα έχουν αναφερθεί για το σύνολο του ΕΚΤ, προηγουμένως, όσον αφορά στην προοπτική οικονομικής ολοκλήρωσης, ισχύουν για τον ΑΠ2Α. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 2Α θα κλείσει με επιλέξιμες δαπάνες ύψους 53,5 εκατ. €, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του κατά 5% περίπου. Παράλληλα, ορισμένες πράξεις / έργα, τα οποία ωριμάζουν στο πλαίσιο του Άξονα

⁵ Το εύρος των 20 ποσοστιαίων μονάδων εξαρτάται από την φύση και κυρίως από το μέγεθος σε προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου

Προτεραιότητας και δεν θα παρουσιάσουν δαπάνες μέχρι και το έτος 2023 ή / και θα συνεχίσουν την λειτουργία τους ορισμένες δομές μετά το 2023, θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτές οι πράξεις / έργα θα έχουν συμβάσεις μέχρι το έτος 2023 συμβατικού τιμήματος της τάξης των 15,0 εκατ. €.

5.2.3 ΑΠ 2Β (Κοινωνικές Υποδομές)

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμβάσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπ' όψη και τις αναμενόμενες συμβάσεις από ήδη ενταγμένες πράξεις, αλλά και από δύο (2) πολύ μικρού προϋπολογισμού προς ένταξη πράξεις, εκτιμάται ότι ο ΑΠ2Β θα κλείσει το οικονομικό του αντικείμενο στο τέλος του 2023 με επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ δαπάνες ύψους της τάξης των 24,00 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό του αυτές οι δαπάνες κατά 15%.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ωριμάζουν πράξεις στις οποίες έχουν υπογραφεί ήδη συμβάσεις μετά το 2020 ή / και θα υπογραφούν μέχρι και το τέλος του 2023, συνολικού επιλέξιμου συμβατικού τιμήματος της τάξης των 22,0 εκατ. €. Αυτές οι πράξεις προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5.2.4 ΑΠ 3 (Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, τουρισμός, πολιτισμός)

Με δεδομένο ότι στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας οι ήδη ενταγμένες πράξεις έχουν συμβάσεις με συμβατικό τίμημα υπερδιπλάσιο του προϋπολογισμού του και αναμένονται νέες συμβάσεις τιμήματος της τάξης των 20,0 εκατ. €, ένα μέρος αυτών των πράξεων με υπογεγραμμένες συμβάσεις μετά το έτος 2020 και μέχρι το τέλος του 2023, θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επιπρόσθετα υφίσταται και μια πράξη με υπογεγραμμένες συμβάσεις («εξοικονόμηση κατ' οίκον») η οποία θα τμηματοποιηθεί στις δύο (2) περιόδους. Το συνολικό συμβατικό τίμημα αυτών των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι της τάξης των 63,00 εκατ. €.

Με αυτό τον προγραμματισμό και με βάση τις εκτιμώμενες δαπάνες των πράξεων που θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας μέχρι το τέλος του 2023 θα υπερβούν κατά τι τα 57, 00 εκατ. €, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό του κατά 20%

5.2.5 ΑΠ 4 (Μεταφορικές υποδομές / δίκτυα)

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας απαιτεί προσεκτικές διαχειριστικές ενέργειες, τόσο εντός του έτους 2022, αλλά και κυρίως εντός του έτους 2023, με δεδομένη την μεγάλη υπέρβαση του προϋπολογισμού του από ενταγμένες πράξεις, εκ των οποίων ορισμένες, σχετικά μεγάλου προϋπολογισμού, τελούν προς άμεση συμβασιοποίηση. Παράλληλα, ο ΑΠ4 περιλαμβάνει πράξεις phased από την περίοδο 2007 – 2013, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της περιόδου 2014 – 2020.

Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις και τις αναμενόμενες από τις ενταγμένες πράξεις, εκτιμάται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας θα κλείσει με επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση ύψους της τάξης των 57,0 εκατ. €, με υπέρβαση του προϋπολογισμού του κατά 8%. Οι πράξεις που ωριμάζουν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας και δεν θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο του Προγράμματος 2014 – 2020, θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 2021 – 2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είτε εξ ολοκλήρου, είτε τμήματα τους. Το εκτιμώμενο συμβατικό τίμημα των συμβάσεων αυτών των πράξεων μέχρι και το τέλος του 2023 φθάνει στα 39,0 εκατ. € περίπου, ενώ για μία (1) ενταγμένη πράξη προς συμβασιοποίηση, με εκτιμώμενο συμβατικό τίμημα της τάξης των 33,0 – 35,0 εκατ. € γίνονται σχετικές συνεννοήσεις / διαβουλεύσεις χρηματοδότησης της από άλλη πηγή συγχρηματοδότησης.

5.2.6 ΑΠ 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ)

Με βάση τις υφιστάμενες υπογεγραμμένες συμβάσεις και τον προγραμματισμό της ΕΥΔ για νέες εντάξεις πράξεων και τις αντίστοιχες αναμενόμενες συμβάσεις για την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος, μέχρι και την διαχειριστική ολοκλήρωση του, συμπεριλαμβανομένων και των νέων δράσεων δημοσιότητας και υλοποίησης του Σχεδιασμού Αξιολόγησης, οι εκτιμώμενες μέχρι και το τέλος του έτους 2023 δαπάνες φθάνουν στα 5,0 εκατ. €, με υπέρβαση του προϋπολογισμού του κατά 13% περίπου.

5.2.7 ΑΠ 7 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ)

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο μέρος του παρόντος εγγράφου, εκτιμάται ότι θα κλείσει το οικονομικό του αντικείμενο με δαπάνες της τάξης των 1,5 εκατ. €, ήτοι με υπέρβαση του προϋπολογισμού του κατά 4% περίπου.

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Α.Π./Θ.Σ./Ε.Π./ΔΡΑΣΗ	ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ, ΔΡΑΣΗ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/9/2022															
			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**					ΕΝΤΑΞΕΙΣ			ΝΟΔΕ			ΔΑΠΑΝΕΣ		
			Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΕΩΝ	Π/Υ	%	ΚΩΔ. ΑΝΟΙΚΤΗΣ / ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΕΣ Ή ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%
ΑΠ01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	48.000.000	93.315.000	194,41%	16	88.499.330	184,37%		3.000.000	2.388	98.079.231	204,3%	2.387	96.704.707	201,47%	1.738	48.176.633	100,37%
Θ.Σ 1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	600.000	7.875.000	1312,50%	5	5.635.772	939,30%		3.000.000	16	2.897.425	482,9%	16	1.945.929	324,32%	5	133.777	22,30%
Ε.Π. 1a	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	200.000	1.875.000	937,50%	1	1.875.000	937,50%		0	6	2.229.700	1114,9%	6	1.278.205	639,10%	0	0	0,00%
Δράση 1.α.1	ΕΕνίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/ και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας	-	1.875.000		1	1.875.000				6	2.229.700		6	1.278.205				
Ε.Π. 1b	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [...] διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	400.000	6.000.000	1500,00%	4	3.760.772	940,19%		3.000.000	10	667.725	166,9%	10	667.725	166,93%	5	133.777	33,44%
Δράση 1.β.1	Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	-	3.000.000		1	3.000.000		ΠΕΛ95	3.000.000									
Δράση 1.β.1.2	Μηχανισμός διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου	-	500.000		1	500.000				1	499.596		1	499.596		1	48.236	
Δράση 1.β.2.1	Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.	-	500.000		1	115.000				8	115.000		8	115.000		3	45.000	
Δράση 1.β.2.2	Ενίσχυση ΜΜΕ για ανάπτυξη υποδομών ποιοτικού ελέγχου, έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας	-	2.000.000		1	145.772				1	53.129		1	53.129		1	40.541	
Θ.Σ 2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)	1.800.000	7.000.000	388,89%	3	7.000.000	388,89%		0	223	7.899.072	438,8%	223	7.899.072	438,84%	2	561.696	31,21%
Ε.Π. 2b	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	100.000	3.750.000	3750,00%	1	3.750.000	3750,00%		0	217	4.901.800	4901,8%	217	4.901.800	4901,80%	0	0	0,00%
Δράση 2.β.2.3	Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών Τουριστικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.	-	3.750.000		1	3.750.000				217	4.901.800		217	4.901.800				
Ε.Π. 2c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.700.000	3.250.000	191,18%	2	3.250.000	191,18%		0	6	2.997.272	176,3%	6	2.997.272	176,31%	2	561.696	33,04%
Δράση 2.γ.1	Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης τουριστικού προορισμού (DMS)	-	2.000.000		1	2.000.000				1	1.876.498		1	1.876.498		1	322.562	
Δράση 2.γ.2.1	Ανάπτυξη/Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών υποδομών των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.	-	1.250.000		1	1.250.000				5	1.120.774		5	1.120.774		1	239.134	
Θ.Σ 3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)	45.600.000	78.440.000	172,02%	8	75.863.558	166,37%		0	2.149	87.282.735	191,4%	2.148	86.859.706	190,48%	1.731	47.481.160	104,13%
Ε.Π. 3a	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	37.700.000	58.940.000	156,34%	7	56.363.558	149,51%		0	1.992	62.533.504	165,9%	1.991	62.110.475	164,75%	1.672	40.939.360	108,59%
Δράση 3.α.1	Συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II	-	2.000.000		1	2.000.000				1	2.000.000		1	2.000.000		1	2.000.000	
Δράση 3.α.2.2	Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών	-	9.500.000		1	9.500.000				116	11.863.393		116	11.863.393				
Δράση 3.α.3.1	Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου		3.000.000		1	423.558				1	423.029							
Δράση 3.α.4	Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	-	40.000.000		1	40.000.000				1.776	41.611.501		1.776	41.611.501		1.671	38.939.360	
Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1	Παροχή ενισχύσεων για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης	-	2.500.000		1	2.500.000				30	3.999.997		30	3.999.997				
Δράση 3α.ΒΑΑ.1	Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας	-	940.000		1	940.000				33	975.179		33	975.179				
Δράση 3α.ΟΧΕ.1	Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης	-	1.000.000		1	1.000.000				35	1.660.405		35	1.660.405				
Ε.Π. 3c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	7.900.000	19.500.000	246,84%	1	19.500.000	246,84%		0	157	24.749.232	313,3%	157	24.749.232	313,28%	59	6.541.800	82,81%
Δράση 3.γ.1	Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (εκχώρηση ΕΠΑΝΕΚ)	-	19.500.000		1	19.500.000				157	24.749.232		157	24.749.232		59	6.541.800	
Χωρικά ΑΠ1	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)*	1.220.000	940.000	77,05%	1	940.000	77,05%		0	33	975.179	79,93%	33	975.179	79,93%	0	0	0,00%
Χωρικά ΑΠ1	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίων)*	600.000	0	0,00%	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Χωρικά ΑΠ1	Στρατηγικές ΒΑΑ*	1.820.000	940.000	51,65%	1	940.000	51,65%		0	33	975.179	53,58%	33	975.179	53,58%	0	0	0,00%
Χωρικά ΑΠ1	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	2.500.000	2.500.000	100,00%	1	2.500.000	100,00%		0	30	3.999.997	160,00%	30	3.999.997	160,00%	0	0	0,00%
Χωρικά ΑΠ1	Στρατηγική ΟΧΕ	1.000.000	1.000.000	100,00%	1	1.000.000	100,00%		0	35	1.660.405	166,04%	35	1.660.405	166,04%	0	0	0,00%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Α.Π./Θ.Σ./Ε.Π./ΔΡΑΣΗ	ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ, ΔΡΑΣΗ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/9/2022																
			ΕΞΕΙΔΙΚΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**					ΕΝΤΑΞΕΙΣ			ΝΟΔΕ			ΔΑΠΑΝΕΣ			
			Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΕΩΝ	Π/Υ	%	ΚΩΔ. ΑΝΟΙΚΤΗΣ / ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΕΣ Ή ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	
ΑΠ2Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	79.572.690	145.430.926	182,76%	51	96.868.333	121,74%		7.540.000	408	117.854.145	148,1%	398	102.266.149	128,52%	40	50.152.230	63,03%	
Θ.Σ 8	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	1.000.000	10.325.000	1032,50%	2	8.800.000	880,00%		3.800.000	341	5.046.800	504,7%	341	5.046.800	504,68%	0	0	0,00%	
Ε.Π. 8iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	900.000	5.800.000	644,44%	1	5.000.000	555,56%		0	341	5.046.800	560,8%	341	5.046.800	560,76%	0	0	0,00%	
Δράση 8.iii.1	Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους	-	5.000.000		1	5.000.000				341	5.046.800		341	5.046.800					
Δράση 8.iii.2	Υποστήριξη ανέργων για ενίσχυση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας	-	800.000																
Ε.Π. 8v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.	100.000	4.525.000	4525,00%	1	3.800.000	3800,00%		3.800.000	0	0	0,0%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Δράση 8.v.2	Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου	-	3.800.000		1	3.800.000		ΠΕΛ119	3.800.000										
Δράση 8.v.3	Κατάρτιση εργαζομένων πολύ μικρών επιχειρήσεων	-	725.000																
Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	78.572.690	135.105.926	171,95%	49	88.068.333	112,09%		3.740.000	67	112.807.345	143,6%	57	97.219.349	123,73%	40	50.152.230	63,83%	
Ε.Π. 9i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηρίας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	18.600.000	34.340.000	184,62%	12	22.963.656	123,46%		0	12	32.053.763	172,3%	8	24.831.763	133,50%	7	22.881.056	123,02%	
Δράση 9.i.1	Δράσεις Ευαισθητοποίησης, Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Δημοσιότητας σε Γυναίκες Άνεργες	-	1.700.000																
Δράση 9.i.2	Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση.	-	5.500.000		1	5.500.000				1	5.475.613								
Δράση 9.i.3	Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / θρεφικοί / θρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ), για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (Πρόγραμμα για την εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής).	-	25.040.000		7	15.263.656				7	24.978.151		7	24.579.902		7	22.881.056		
Δράση 9.i.4	Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας	-	1.000.000		1	500.000				1	500.000								
Δράση 9i.BAA.1	Ενεργητική Ένταξη στην Εργασία Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών	-	600.000		2	1.200.000				2	600.000								
Δράση 9i.OXE.1	Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων ευπαθών ομάδων μέσω πρακτικής άσκησης σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης	-	500.000		1	500.000				1	500.000		1	251.861					
Ε.Π. 9ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	3.500.000	13.234.000	378,11%	5	5.249.440	149,98%		2.500.000	7	4.719.923	134,9%	6	4.254.138	121,55%	6	1.562.779	44,65%	
Δράση 9.ii.1α	Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον (Ρομά). (Επιδότηση ενοικίου)	-	1.290.000																
Δράση 9.ii.1β	Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον (Ρομά)	-	1.620.000																
Δράση 9.ii.3	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα). (κέντρα κοινότητας)	-	9.700.000		4	4.949.440		ΠΕΛ106	2.500.000	6	4.572.523		6	4.254.138		6	1.562.779		
Δράση 9.ii.4	Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική των Ρομά	-	324.000																
Δράση 9ii.BAA.1	Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών	-	300.000		1	300.000				1	147.400								
Ε.Π. 9iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	6.000.000	16.298.000	271,63%	17	13.213.311	220,22%		0	21	11.643.644	194,1%	21	10.897.346	181,62%	15	5.999.158	99,99%	
Δράση 9.iii.1	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (Εναρμόνιση ΑΜΕΑ)	-	1.120.000		6	1.254.880				6	1.098.182		6	947.727		6	884.093		
Δράση 9.iii.3	Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ) (Ξενώνες κατοπινημένων γυναικών / κέντρα συμβουλευτικής γυναικών)	-	3.150.000		3	1.214.671				4	3.024.257		4	2.963.455		4	1.939.184		
Δράση 9.iii.4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	-	4.100.000		6	4.543.760				6	4.097.133		6	4.097.133		5	3.175.881		
Δράση 9.iii.5	Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ)	-	1.728.000																
Δράση 9.iii.6	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης	-	5.000.000		1	5.000.000				4	2.006.444		4	1.768.880					
Δράση 9.iii.7	Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες	-	1.200.000		1	1.200.000				1	1.417.628		1	1.120.151					
Ε.Π. 9iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	45.472.690	64.208.926	141,20%	13	40.966.926	90,09%		1.240.000	25	58.715.092	129,1%	20	52.171.399	114,73%	11	17.554.704	38,60%	
Δράση 9.iv.1	Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων.	-	1.250.000		1	150.000				2	1.072.000		2	1.072.000		2	816.316		
Δράση 9.iv.3	Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	-	9.286.226		1	9.286.226				1	9.286.226		1	9.286.226		1	1.944.358		
Δράση 9.iv.4	Δομές και Δράσεις Παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	-	5.000.000		2	4.809.088				10	4.934.052		8	2.589.969		3	471.397		
Δράση 9.iv.6	Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	-	2.600.000		1	2.498.912				4	2.062.642		4	2.062.642		4	569.494		
Δράση 9.iv.8	Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και προώθησης της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	-	1.000.000																
Δράση 9.iv.9	Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη	-	232.700		1	232.700				1	244.843								
Δράση 9.iv.10	Δράσεις και Υπηρεσίες Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ)	-	350.000																
Δράση 9.iv.12	Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων	-	3.300.000		1	3.300.000				1	3.298.511								
Δράση 9.iv.13	Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19	-	37.000.000		2	16.500.000				2	35.722.761		2	35.712.761		1	13.753.138		
Δράση 9iv.BAA.1	Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δ. Καλαμάτας για τις ευάλωτες ομάδες (ΚΔΗΦ / ΚΗΦΗ)	-	2.550.000		2	2.550.000				2	1.694.056		2	1.247.800					
Δράση 9iv.BAA.2	Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα	-	1.240.000		1	1.240.000		BAA16	1.240.000										
Δράση 9iv.OXE.1	Βελτίωση της πρόσβασης σε προνοιακές - κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας	-	400.000		1	400.000				2	400.000		1	200.000					

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Α.Π./Θ.Σ./Ε.Π./ΔΡΑΣΗ	ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ, ΔΡΑΣΗ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/9/2022															
			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**					ΕΝΤΑΞΕΙΣ			ΝΟΔΕ			ΔΑΠΑΝΕΣ		
			Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΕΩΝ	Π/Υ	%	ΚΩΔ. ΑΝΟΙΚΤΗΣ / ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΕΣ Ή ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%
Ε.Π. 9ν	Πρωώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	500.000	150.000	30,00%	0	0	0,00%		0	0	0	0,0%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Δράση 9.ν.1	Οριζόντιες παρεμβάσεις για την πρωώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρήσεων	-	150.000															
Ε.Π. 9νι	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	4.500.000	6.875.000	152,78%	2	5.675.000	126,11%		0	2	5.674.924	126,1%	2	5.064.704	112,55%	1	2.154.534	47,88%
Δράση 9νι.ΤΑΠΤοΚ.1	Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνομόνων και λοιπών συνεργατών για την λειτουργία της ΟΤΔ "ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ	-	2.850.000		1	2.850.000				1	2.850.000		1	2.850.000		1	1.401.674	
Δράση 9νι.ΤΑΠΤοΚ.2	Δράσεις Εμφύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας	-	1.425.000		1	1.425.000				1	1.425.000		1	1.425.000		1	752.860	
Δράση 9νι.ΤΑΠΤοΚ.3	Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επείγοντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ	-	1.200.000															
Δράση 9νι.ΤΑΠΤοΚ.4	Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων	-	1.400.000		1	1.400.000				1	1.399.924		1	789.704				
Χωρικά ΑΠ2Α	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)*	2.730.000	3.790.000	138,83%	3	3.790.000	138,83%		1.240.000	2	1.694.056	62,05%	2	1.247.800	45,71%	0	0	0,00%
Χωρικά ΑΠ2Α	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίων)*	2.520.000	900.000	35,71%	3	1.500.000	59,52%		0	3	747.400	29,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Χωρικά ΑΠ2Α	Στρατηγικές ΒΑΑ*	5.250.000	4.690.000	89,33%	6	5.290.000	100,76%		1.240.000	5	2.441.456	46,50%	2	1.247.800	23,77%	0	0	0,00%
Χωρικά ΑΠ2Α	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	6.250.000	6.875.000	110,00%	2	5.675.000	90,80%		0	2	5.674.924	90,80%	2	5.064.704	81,04%	1	2.154.534	34,47%
Χωρικά ΑΠ2Α	Στρατηγική ΟΧΕ	900.000	900.000	100,00%	2	900.000	100,00%		0	3	900.000	100,00%	2	451.861	50,21%	0	0	0,00%
ΑΠ2Β	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	20.700.000	69.535.000	335,92%	28	72.884.996	352,10%		900.000	52	62.337.992	301,1%	43	41.136.808	198,73%	29	14.963.627	72,29%
Θ.Σ 9	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9.300.000	35.285.000	379,41%	20	35.414.996	380,81%		900.000	40	35.558.492	382,3%	31	17.600.142	189,25%	20	6.690.176	71,94%
Ε.Π. 9α	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	6.500.000	25.910.000	398,62%	11	26.628.972	409,68%		0	27	28.044.883	431,5%	23	15.757.266	242,42%	16	6.236.727	95,95%
Δράση 9.α.1	Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Α΄βάθμιας υγείας	-	4.410.000		3	4.403.260				11	4.330.344		11	4.135.178		10	1.778.646	
Δράση 9.α.2	Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Β΄βάθμιας υγείας	-	9.500.000		3	9.530.000				9	13.249.315		8	8.885.612		4	2.990.807	
Δράση 9.α.3	Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής	-	12.000.000		5	12.695.712				7	10.465.223		4	2.736.475		2	1.467.274	
Ε.Π. 9β	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.300.000	6.625.000	509,62%	4	5.577.000	429,00%		900.000	5	4.874.994	375,0%	2	567.984	43,69%	0	0	0,00%
Δράση 9.β.1.ΟΧΕ	Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμων Ανατολικής Μάνης και Δυτικής Μάνης	-	4.700.000		3	4.977.000		ΟΧΕ16	900.000	4	4.274.994		1	100.946				
Δράση 9.β.2.ΟΧΕ	Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης	-	1.925.000		1	600.000				1	600.000		1	467.037				
Ε.Π. 9δ	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	1.500.000	2.750.000	183,33%	5	3.209.024	213,93%		0	8	2.638.616	175,9%	6	1.274.893	84,99%	4	453.449	30,23%
Δράση 9δ.ΤΑΠΤοΚ.1	Λειτουργικές Δαπάνες ΟΤΔ	-	475.000		2	1.025.000				1	475.000		1	475.000		1	250.949	
Δράση 9δ.ΤΑΠΤοΚ.2	Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος	-	1.740.000		3	2.184.024				7	2.163.616		5	799.893		3	202.500	
Δράση 9δ.ΤΑΠΤοΚ.3	Δημιουργία / βελτίωση υποδομών άθλησης και αναψυχής	-	535.000					ΤΑΠΤοΚ30 (υπό έκδοση)										
Θ.Σ 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	11.400.000	34.250.000	300,44%	8	37.470.000	328,68%		0	12	26.779.500	234,9%	12	23.536.666	206,46%	9	8.273.451	72,57%
Ε.Π. 10α	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	11.400.000	34.250.000	300,44%	8	37.470.000	328,68%		0	12	26.779.500	234,9%	12	23.536.666	206,46%	9	8.273.451	72,57%
Δράση 10.1α	Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	-	19.000.000		6	24.150.000				9	14.225.252		9	12.391.472		7	7.331.412	
Δράση 10.1β	Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης	-	3.750.000		1	1.820.000				2	974.943		2	974.943		2	942.039	
Δράση 10.1γ	Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης - εξοπλισμός	-	11.500.000		1	11.500.000				1	11.579.305		1	10.170.252				
Χωρικά ΑΠ2Β	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	2.750.000	2.750.000	100,00%	5	3.209.024	116,69%		0	8	2.638.616	95,95%	6	1.274.893	46,36%	4	453.449	16,49%
Χωρικά ΑΠ2Β	Στρατηγική ΟΧΕ	2.250.000	6.625.000	294,44%	4	5.577.000	247,87%		900.000	5	4.874.994	216,67%	2	567.984	25,24%	0	0	0,00%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020																		
ΠΙΝΑΚΑΣ 1																		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ																		
Α.Π./Θ.Σ./Ε.Π./ΔΡΑΣΗ	ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ, ΔΡΑΣΗ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/9/2022															
			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**					ΕΝΤΑΞΕΙΣ			ΝΟΔΕ			ΔΑΠΑΝΕΣ		
			Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΕΩΝ	Π/Υ	%	ΚΩΔ. ΑΝΟΙΚΤΗΣ / ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΕΣ Ή ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%
ΑΠ03	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	47.800.000	138.130.000	288,97%	39	113.659.416	237,78%		1.050.000	107	133.436.352	279,2%	85	101.588.193	212,53%	47	24.914.165	52,12%
Θ.Σ 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	3.000.000	25.290.000	843,00%	4	3.586.539	119,55%		500.000	6	22.457.942	748,6%	6	22.298.813	743,29%	5	2.088.483	69,62%
Ε.Π. 4c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, [...] της στέγασης	3.000.000	25.290.000	843,00%	4	3.586.539	119,55%		500.000	6	22.457.942	748,6%	6	22.298.813	743,29%	5	2.088.483	69,62%
Δράση 4.γ.2	Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.	–	21.500.000		1	1.500.000				1	21.500.000		1	21.441.726		1	1.566.615	
Δράση 4γ.ΒΑΑ.1	Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών Κτηρίων	–	390.000		1	390.000				1	174.984		1	174.984		1	171.767	
Δράση 4γ-6ε.ΒΑΑ.1	Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση της Νεοκλασικής Αγοράς Άργους	–	2.050.000															
Δράση 4γ.ΤΑΠΤοΚ.1	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων	–	1.350.000		2	1.696.539		ΤΑΠΤοΚ27	500.000	4	782.959		4	682.103		3	350.101	
Θ.Σ 5	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	4.500.000	17.650.000	392,22%	5	17.765.000	394,78%		0	7	19.333.299	429,6%	7	15.419.071	342,65%	2	1.811.071	40,25%
Ε.Π. 5a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	4.500.000	17.650.000	392,22%	5	17.765.000	394,78%		0	7	19.333.299	429,6%	7	15.419.071	342,65%	2	1.811.071	40,25%
Δράση 5.α.1	Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις	–	3.500.000		1	3.500.000				3	6.582.001		3	6.582.001		1	1.697.164	
Δράση 5.α.5.02	Μελέτη Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)	–	150.000		1	150.000				1	225.300		1	225.300		1	113.907	
Δράση 5.α.3	Έργα πυροπροστασίας των δασών ή / και άλλων έργων πρόληψης καταστροφών ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών (πυροσβεστικά οχήματα).	–	2.500.000		1	2.500.000				1	2.526.000		1	2.516.845				
Δράση 5.α.4	Μικρά αντιπλημμυρικά έργα	–	6.500.000		1	6.615.000				1	5.000.000		1	4.112.428				
Δράση 5.α.5	Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών	–	5.000.000		1	5.000.000				1	4.999.998		1	1.982.498				
Θ.Σ 6	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	40.300.000	95.190.000	236,20%	30	92.307.878	229,05%		550.000	94	91.645.111	227,4%	72	63.870.309	158,49%	40	21.014.610	52,15%
Ε.Π. 6a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης [...] υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.000.000	3.150.000	157,50%	2	2.760.000	138,00%		0	3	3.152.080	157,6%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Δράση 6.α.1.ΟΧΕ	Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης	–	3.150.000		2	2.760.000				3	3.152.080							
Ε.Π. 6b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης [...] υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	14.000.000	20.270.000	144,79%	9	24.021.582	171,58%		0	24	23.042.767	164,6%	17	14.420.510	103,00%	15	10.098.561	72,13%
Δράση 6.β.1	Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού	–	18.000.000		5	21.800.000				18	21.279.602		13	13.621.373		12	9.929.444	
Δράση 6.β.4	Παρακολούθηση / διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ	–	420.000		1	420.000				1	317.561		1	164.799		1	85.810	
Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1	Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού	–	1.320.000		2	1.338.463				4	982.485		3	634.338		2	83.307	
Δράση 6β.ΟΧΕ.1	Έργα διαχείρισης/επεξεργασίας λυμάτων	–	530.000		1	463.118				1	463.118							
Ε.Π. 6c	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	16.425.000	45.425.000	276,56%	13	35.812.800	218,04%		0	51	45.897.866	279,4%	41	36.364.689	221,40%	17	9.640.797	58,70%
Δράση 6.γ.1	Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)	–	22.000.000		3	16.400.000				28	24.804.042		27	22.305.650		10	3.418.708	
Δράση 6.γ.2	Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)	–	9.600.000		2	8.000.000				5	8.422.060		4	6.533.574		2	1.139.135	
Δράση 6.γ.3	Τουριστική Προβολή θεματικών μορφών Τουρισμού - Πολιτιστικού / Φυσικού αποθέματος – Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις – Διενέργεια στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας	–	6.200.000		1	3.700.000				2	6.206.424		2	5.094.924		2	4.846.638	
Δράση 6γ.ΒΑΑ.1	Δημιουργία σύγχρονων μέσων προώθησης/προβολής των πολιτιστικών/τουριστικών πόρων της πόλης	–	300.000		1	300.000				1	277.388		1	192.460		1	39.915	
Δράση 6γ.ΒΑΑ.2	Παρεμβάσεις ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καλαμάτας	–	1.400.000		1	1.400.000				1	1.452.500							
Δράση 6γ.ΒΑΑ.3	Ολοκληρωμένη ανάδειξη ταυτότητας προορισμού – Place branding Δήμου Άργους - Μυκηνών	–	150.000															
Δράση 6γ.ΤΑΠΤοΚ.1	Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς	–	1.550.000		1	1.437.800				2	926.242		2	817.071		2	196.401	
Δράση 6.γ.1.ΟΧΕ	Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς	–	1.075.000		1	1.075.000				2	1.003.575		1	567.575				
Δράση 6.γ.2.ΟΧΕ	Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς	–	1.350.000		2	1.700.000				6	1.018.600		3	198.723				
Δράση 6.γ.3.ΟΧΕ	Προώθηση - προβολή φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	–	1.800.000		1	1.800.000				4	1.787.035		1	654.713				
Ε.Π. 6d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους [...] του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.875.000	1.180.000	62,93%	2	1.730.000	92,27%		550.000	1	1.180.000	62,9%	1	516.612	27,55%	0	0	0,00%
Δράση 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1	Παρεμβάσεις προστασίας – αξιοποίησης φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του οικοτουρισμού	–	1.180.000		2	1.730.000		ΤΑΠΤοΚ28	550.000	1	1.180.000		1	516.612				
Ε.Π. 6e	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων [...] προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	6.000.000	25.165.000	419,42%	4	27.983.496	466,39%		0	15	18.372.399	306,2%	13	12.568.497	209,47%	8	1.275.252	21,25%
Δράση 6.ε.1	Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές ΒΑΑ	–	17.000.000		1	19.118.496				9	13.525.827		7	8.314.361		3	634.474	
Δράση 6ε.ΒΑΑ.1	Πλέγμα Αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην Παραλιακή Ζώνη Καλαμάτας	–	3.665.000		1	3.665.000				4	2.688.158		4	2.347.623		3	330.802	
Δράση 6ε.ΒΑΑ.2	Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος	–	4.500.000		2	5.200.000				2	2.158.413		2	1.906.513		2	309.976	
Χωρικά ΑΠ3	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)*	5.215.000	5.755.000	110,35%	4	5.755.000	110,35%		0	7	4.593.029	88,07%	6	2.715.067	52,06%	5	542.484	10,40%
Χωρικά ΑΠ3	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίων)*	5.300.000	6.700.000	126,42%	2	5.200.000	98,11%		0	2	2.158.413	40,72%	2	1.906.513	35,97%	2	309.976	5,85%
Χωρικά ΑΠ3	Στρατηγικές ΒΑΑ*	10.515.000	12.455.000	118,45%	6	10.955.000	104,18%		0	9	6.751.442	64,21%	8	4.621.580	43,95%	7	852.459	8,11%
Χωρικά ΑΠ3	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	5.725.000	5.400.000	94,32%	7	6.202.802	108,35%		1.050.000	11	3.871.686	67,63%	10	2.650.125	46,29%	7	629.809	11,00%
Χωρικά ΑΠ3	Στρατηγική ΟΧΕ	5.450.000	7.905.000	145,05%	7	7.798.118	143,08%		0	16	7.424.408	136,23%	5	1.421.011	26,07%	0	0	0,00%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Α.Π./Θ.Σ./Ε.Π./ΔΡΑΣΗ	ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ, ΔΡΑΣΗ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/9/2022																
			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ			ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**					ΕΝΤΑΞΕΙΣ			ΝΟΔΕ			ΔΑΠΑΝΕΣ		
			Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΕΩΝ	Π/Υ	%	ΚΩΔ. ΑΝΟΙΚΤΗΣ / ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΕΣ Ή ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	
ΑΠ04	ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	52.966.553	168.125.000	317,42%	12	163.279.789	308,27%		20.300.000	14	142.702.082	269,4%	11	74.612.078	140,87%	8	47.801.999	90,25%	
Θ.Σ 7	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	52.966.553	168.125.000	317,42%	12	163.279.789	308,27%		20.300.000	14	142.702.082	269,4%	11	74.612.078	140,87%	8	47.801.999	90,25%	
Ε.Π. 7b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	42.966.553	162.125.000	377,33%	11	157.279.789	366,05%		14.300.000	14	142.702.082	332,1%	11	74.612.078	173,65%	8	47.801.999	111,25%	
Δράση 7.β.1	Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας	–	137.500.000		7	135.319.789				12	136.694.292		10	68.759.905		7	42.809.834		
Δράση 7.β.3	Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας	–	7.500.000		1	7.500.000				1	5.882.791		1	5.852.173		1	4.992.165		
Δράση 7.β.5	Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο» που συνδέει τα εν λόγω αστικά κέντρα της περιφέρειας με το διευρωπαϊκό δίκτυο	–	12.000.000		1	12.000.000		ΠΕΛ112	12.000.000										
Δράση 7β.ΤΑΠΤοΚ.1	Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία	–	125.000		1	160.000				1	125.000								
Δράση 7β.ΤΑΠΤοΚ.2	Βελτίωση προσβασιμότητας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας	–	2.300.000		1	2.300.000		ΤΑΠΤοΚ11	2.300.000										
Δράση 7β.ΟΧΕ.1	Αναβάθμιση/ βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων	–	700.000																
Δράση 7β.ΟΧΕ.2	Αναβάθμιση / βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση οδικής ασφάλειας	–	2.000.000																
Ε.Π. 7ε	Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανακατασκευής εξοπλισμών συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	10.000.000	6.000.000	60,00%	1	6.000.000	60,00%		6.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Δράση 7.ε.1	Δημιουργία / κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου	–	6.000.000		1	6.000.000		ΠΕΛ113	6.000.000										
Χωρικά ΑΠ4	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	1.775.000	2.425.000	136,62%	2	2.460.000	138,59%		2.300.000	1	125.000	7,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Χωρικά ΑΠ4	Στρατηγική ΟΧΕ	2.500.000	2.700.000	108,00%	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ΑΠ05	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	4.417.840	5.482.840	124,11%	1	5.482.840	124,11%		0	17	4.770.502	108,0%	17	4.505.128	101,98%	17	3.978.744	90,06%	
ΤΒ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	4.417.840	5.482.840	124,11%	1	5.482.840	124,11%		0	17	4.770.502	108,0%	17	4.505.128	101,98%	17	3.978.744	90,06%	
Δράση 5.1	Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης	–	850.000		0	850.000				4	743.820		4	652.380		4	449.825		
Δράση 5.2	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	–	1.400.000		0	1.400.000				6	1.188.697		6	1.084.426		6	876.664		
Δράση 5.3	Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες	–	720.000		0	720.000				3	609.263		3	608.420		3	581.234		
Δράση 5.4	Τεχνικοί Σύμβουλοι	–	2.130.000		0	2.130.000				3	2.086.122		3	2.017.302		3	1.928.421		
Δράση 5.5	Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων	–	147.840		0	147.840													
Δράση 5.6	Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου	–	235.000		0	235.000				1	142.600		1	142.600		1	142.600		
ΑΠ06	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	1.448.249	1.461.569	100,92%	1	1.461.569	100,92%		0	8	1.024.591	70,7%	7	826.792	57,09%	7	791.393	54,64%	
ΤΒ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	1.448.249	1.461.569	100,92%	1	1.461.569	100,92%		0	8	1.024.591	70,7%	7	826.792	57,09%	7	791.393	54,64%	
Δράση 6.1	Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης	–	165.000		0	165.000				2	110.000		2	107.048		2	82.809		
Δράση 6.2	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	–	388.169		0	388.169				2	262.000		1	70.997		1	70.997		
Δράση 6.3	Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες	–	342.000		0	342.000				2	157.356		2	157.356		2	157.356		
Δράση 6.4	Τεχνικοί Σύμβουλοι	–	405.000		0	405.000				3	495.235		3	491.391		3	480.231		
Δράση 6.5	Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων	–	136.400		0	136.400													
Δράση 6.6	Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου	–	25.000		0	25.000													
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	254.905.332	621.480.335	243,81%	148	542.136.274	212,68%		32.790.000	2.994	560.204.896	219,8%	2.948	421.639.856	165,41%	1.886	190.778.790	74,84%	
ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	173.884.393	474.587.840	272,93%	96	443.806.372	255,23%		25.250.000	2.578	441.326.160	253,8%	2.543	318.546.915	183,19%	1.839	139.835.167	80,42%	
ΕΚΤ	ΕΚΤ	81.020.939	146.892.495	181,30%	52	98.329.902	121,36%		7.540.000	416	118.878.737	146,7%	405	103.092.942	127,24%	47	50.943.623	62,88%	
Χωρικά	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)*	9.165.000	10.485.000	114,40%	8	10.485.000	114,40%		1.240.000	42	7.262.264	79,2%	41	4.938.045	53,88%	5	542.484	5,92%	
Χωρικά	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίων)*	8.420.000	7.600.000	90,26%	5	6.700.000	79,57%		0	5	2.905.813	34,5%	2	1.906.513	22,64%	2	309.976	3,68%	
Χωρικά	Στρατηγικές ΒΑΑ*	17.585.000	18.085.000	102,84%	13	17.185.000	97,73%		1.240.000	47	10.168.077	57,8%	43	6.844.559	38,92%	7	852.459	4,85%	
Χωρικά	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	19.000.000	19.950.000	105,00%	17	20.046.825	105,51%		3.350.000	52	16.310.224	85,8%	48	12.989.719	68,37%	12	3.237.792	17,04%	
Χωρικά	Στρατηγική ΟΧΕ	12.100.000	19.130.000	158,10%	14	15.275.118	126,24%		900.000	59	14.859.807	122,8%	44	4.101.261	33,89%	0	0	0,00%	
Χωρικά_ΕΤΠΑ	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)*	6.435.000	6.695.000	104,04%	5	6.695.000	104,04%		0	40	5.568.208	86,5%	39	3.690.245	57,35%	5	542.484	8,43%	
Χωρικά_ΕΤΠΑ	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίων)*	5.900.000	6.700.000	113,56%	2	5.200.000	88,14%		0	2	2.158.413	36,6%	2	1.906.513	32,31%	2	309.976	5,25%	
Χωρικά_ΕΤΠΑ	Στρατηγικές ΒΑΑ*	12.335.000	13.395.000	108,59%	7	11.895.000	96,43%		0	42	7.726.621	62,6%	41	5.596.759	45,37%	7	852.459	6,91%	
Χωρικά_ΕΤΠΑ	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	12.750.000	13.075.000	102,55%	15	14.371.825	112,72%		3.350.000	50	10.635.300	83,4%	46	7.925.015	62,16%	11	1.083.258	8,50%	
Χωρικά_ΕΤΠΑ	Στρατηγική ΟΧΕ	11.200.000	18.230.000	162,77%	12	14.375.118	128,35%		900.000	56	13.959.807	124,6%	42	3.649.400	32,58%	0	0	0,00%	
Χωρικά_ΕΚΤ	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)*	2.730.000	3.790.000	138,83%	3	3.790.000	138,83%		1.240.000	2	1.694.056	62,1%	2	1.247.800	45,71%	0	0	0,00%	
Χωρικά_ΕΚΤ	Στρατηγική ΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίων)*	2.520.000	900.000	35,71%	3	1.500.000	59,52%		0	3	747.400	29,7%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Χωρικά_ΕΚΤ	Στρατηγικές ΒΑΑ*	5.250.000	4.690.000	89,33%	6	5.290.000	100,76%		1.240.000	5	2.441.456	46,5%	2	1.247.800	23,77%	0	0	0,00%	
Χωρικά_ΕΚΤ	Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ*	6.250.000	6.875.000	110,00%	2	5.675.000	90,80%		0	2	5.674.924	90,8%	2	5.064.704	81,04%	1	2.154.534	34,47%	
Χωρικά_ΕΚΤ	Στρατηγική ΟΧΕ	900.000	900.000	100,00%	2	900.000	100,00%		0	3	900.000	100,0%	2	451.861	50,21%	0	0	0,00%	

* Ο προϋπολογισμός των Στρατηγικών ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ αφορά στον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων αντίστοιχων Στρατηγικών.

** Ο προϋπολογισμός των Προσκλήσεων, οι οποίες έχουν λήξει έχει προσαρμοσθεί στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων.

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020																	
ΠΙΝΑΚΑΣ 2																	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΑΝΑ ΑΠ ΚΑΙ ΘΣ																	
Α.Π./Θ.Σ.	ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠ, ΘΣ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/9/2022														
			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ*				ΕΝΤΑΞΕΙΣ			ΝΟΔΕ			ΔΑΠΑΝΕΣ		
			Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	Π/Υ	%	ΑΝΟΙΚΤΕΣ Ή ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	Π/Υ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%	ΑΡ.ΠΡΑΞΕΩΝ	ΠΟΣΟ	%
ΑΠ01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	48.000.000	93.315.000	194,41%	16	88.499.330	184,37%	3.000.000	2.388	98.079.231	204,3%	2.387	96.704.707	201,47%	1.738	48.176.633	100,37%
Θ.Σ 1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	600.000	7.875.000	1312,50%	5	5.635.772	939,30%	3.000.000	16	2.897.425	482,9%	16	1.945.929	324,32%	5	133.777	22,30%
Θ.Σ 2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)	1.800.000	7.000.000	388,89%	3	7.000.000	388,89%	0	223	7.899.072	438,8%	223	7.899.072	438,84%	2	561.696	31,21%
Θ.Σ 3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)	45.600.000	78.440.000	172,02%	8	75.863.558	166,37%	0	2.149	87.282.735	191,4%	2.148	86.859.706	190,48%	1.731	47.481.160	104,13%
ΑΠ2Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	79.572.690	145.430.926	182,76%	51	96.868.333	121,74%	7.540.000	408	117.854.145	148,1%	398	102.266.149	128,52%	40	50.152.230	63,03%
Θ.Σ 8	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	1.000.000	10.325.000	1032,50%	2	8.800.000	880,00%	3.800.000	341	5.046.800	504,7%	341	5.046.800	504,68%	0	0	0,00%
Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	78.572.690	135.105.926	171,95%	49	88.068.333	112,09%	3.740.000	67	112.807.345	143,6%	57	97.219.349	123,73%	40	50.152.230	63,83%
ΑΠ2Β	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	20.700.000	69.535.000	335,92%	28	72.884.996	352,10%	900.000	52	62.337.992	301,1%	43	41.136.808	198,73%	29	14.963.627	72,29%
Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	9.300.000	35.285.000	379,41%	20	35.414.996	380,81%	900.000	40	35.558.492	382,3%	31	17.600.142	189,25%	20	6.690.176	71,94%
Θ.Σ 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	11.400.000	34.250.000	300,44%	8	37.470.000	328,68%	0	12	26.779.500	234,9%	12	23.536.666	206,46%	9	8.273.451	72,57%
ΑΠ03	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	47.800.000	138.130.000	288,97%	39	113.659.416	237,78%	1.050.000	107	133.436.352	279,2%	85	101.588.193	212,53%	47	24.914.165	52,12%
Θ.Σ 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	3.000.000	25.290.000	843,00%	4	3.586.539	119,55%	500.000	6	22.457.942	748,6%	6	22.298.813	743,29%	5	2.088.483	69,62%
Θ.Σ 5	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	4.500.000	17.650.000	392,22%	5	17.765.000	394,78%	0	7	19.333.299	429,6%	7	15.419.071	342,65%	2	1.811.071	40,25%
Θ.Σ 6	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	40.300.000	95.190.000	236,20%	30	92.307.878	229,05%	550.000	94	91.645.111	227,4%	72	63.870.309	158,49%	40	21.014.610	52,15%
ΑΠ04	ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	52.966.553	168.125.000	317,42%	12	163.279.789	308,27%	20.300.000	14	142.702.082	269,4%	11	74.612.078	140,87%	8	47.801.999	90,25%
Θ.Σ 7	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	52.966.553	168.125.000	317,42%	12	163.279.789	308,27%	20.300.000	14	142.702.082	269,4%	11	74.612.078	140,87%	8	47.801.999	90,25%
ΑΠ05	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	4.417.840	5.482.840	124,11%	1	5.482.840	124,11%	0	17	4.770.502	108,0%	17	4.505.128	101,98%	17	3.978.744	90,06%
ΑΠ06	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	1.448.249	1.461.569	100,92%	1	1.461.569	100,92%	0	8	1.024.591	70,7%	7	826.792	57,09%	7	791.393	54,64%
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	254.905.332	621.480.335	243,81%	148	542.136.274	212,68%	32.790.000	2.994	560.204.896	219,8%	2.948	421.639.856	165,41%	1.886	190.778.790	74,84%
ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	173.884.393	474.587.840	272,93%	96	443.806.372	255,23%	25.250.000	2.578	441.326.160	253,8%	2.543	318.546.915	183,19%	1.839	139.835.167	80,42%
ΕΚΤ	ΕΚΤ	81.020.939	146.892.495	181,30%	52	98.329.902	121,36%	7.540.000	416	118.878.737	146,7%	405	103.092.942	127,24%	47	50.943.623	62,88%

* Ο προϋπολογισμός των Προσκλήσεων, οι οποίες έχουν λήξει έχει προσαρμοσθεί στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων.

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027

Α.Π./ΤΑΜΕΙΟ/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ			ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΔΕ		ΔΑΠΑΝΕΣ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027				ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 2021-2027
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ		ΑΝΟΙΚΤΕΣ / ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ "ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ"	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ) + ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ				"ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ"*		PHASING	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ (ΕΚΤ)	
Π/Υ	%	Π/Υ	Π/Υ	Π/Υ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΟΔΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΟΔΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΟΔΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΟΔΕ	
ΑΠ01	48.000.000	88.499.330	184,4%	3.000.000	98.079.231	204,3%	96.704.707	201,5%	48.176.633	37.883	48.214.516	100,4%	57.500.000	119,8%	20.730.522	19.865.493	0	0	19.865.493
ΑΠ2Α	79.572.690	96.868.333	121,7%	7.540.000	117.854.145	148,1%	102.266.149	128,5%	50.152.230	2.091.208	52.243.438	65,7%	83.500.000	104,9%	7.770.955	7.090.000	5.000.000	2.545.000	14.635.000
ΑΠ2Β	20.700.000	72.884.996	352,1%	900.000	62.337.992	301,1%	41.136.808	198,7%	14.963.627	286.151	15.249.778	73,7%	23.800.000	115,0%	25.064.251	21.449.275	900.000	0	22.349.275
ΑΠ03	47.800.000	113.659.416	237,8%	1.050.000	133.436.352	279,2%	101.588.193	212,5%	24.914.165	3.954.778	28.868.943	60,4%	57.200.000	119,7%	55.994.389	50.496.506	12.400.000	0	62.896.506
ΑΠ04	52.966.553	163.279.789	308,3%	20.300.000	142.702.082	269,4%	74.612.078	140,9%	47.801.999	410.924	48.212.923	91,0%	57.200.000	108,0%	45.211.926	36.052.505	2.700.000	0	38.752.505
ΑΠ05	4.417.840	5.482.840	124,1%	0	4.770.502	108,0%	4.505.128	102,0%	3.978.744	0	3.978.744	90,1%	5.000.000	113,2%	0	0	0	0	0
ΑΠ06	1.448.249	1.461.569	100,9%	0	1.024.591	70,7%	826.792	57,1%	791.393	0	791.393	54,6%	1.500.000	103,6%	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	254.905.332	542.136.274	212,7%	32.790.000	560.204.896	219,8%	421.639.856	165,4%	190.778.790	6.780.944	197.559.734	77,5%	285.700.000	112,1%	154.772.042	134.953.779	21.000.000	2.545.000	158.498.779
ΕΤΠΑ	173.884.393	443.806.372	255,2%	25.250.000	441.326.160	253,8%	318.546.915	183,2%	139.835.167	4.689.736	144.524.903	83,1%	200.700.000	115,4%	147.001.087	127.863.779	16.000.000	0	143.863.779
ΕΚΤ	81.020.939	98.329.902	121,4%	7.540.000	118.878.737	146,7%	103.092.942	127,2%	50.943.623	2.091.208	53.034.831	65,5%	85.000.000	104,9%	7.770.955	7.090.000	5.000.000	2.545.000	14.635.000
ΣΒΑΑ (Δήμου Καλαμάτας)	9.165.000	10.485.000	114,4%	1.240.000	7.262.264	79,2%	4.938.045	53,9%	542.484	0	542.484	5,9%	4.800.000	52,4%	1.452.500	1.016.750	0	840.000	1.856.750
ΣΒΑΑ (Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίων)	8.420.000	6.700.000	79,6%	0	2.905.813	34,5%	1.906.513	22,6%	309.976	0	309.976	3,7%	2.600.000	30,9%	0	0	0	0	0
Στρατηγικές ΒΑΑ	17.585.000	17.185.000	97,7%	1.240.000	10.168.077	57,8%	6.844.559	38,9%	852.459	0	852.459	4,8%	7.400.000	42,1%	1.452.500	1.016.750	0	840.000	1.856.750
Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ	19.000.000	20.046.825	105,5%	3.350.000	16.310.224	85,8%	12.989.719	68,4%	3.237.792	464.297	3.702.090	19,5%	10.800.000	56,8%	0	0	0	0	0
Στρατηγική ΟΧΕ	12.100.000	15.275.118	126,2%	900.000	14.859.807	122,8%	4.101.261	33,9%	0	0	0	0,0%	9.100.000	75,2%	0	0	0	0	0

* Δεν υπολογίζεται το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΜΥΚΗΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ" με MIS 5092190.

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

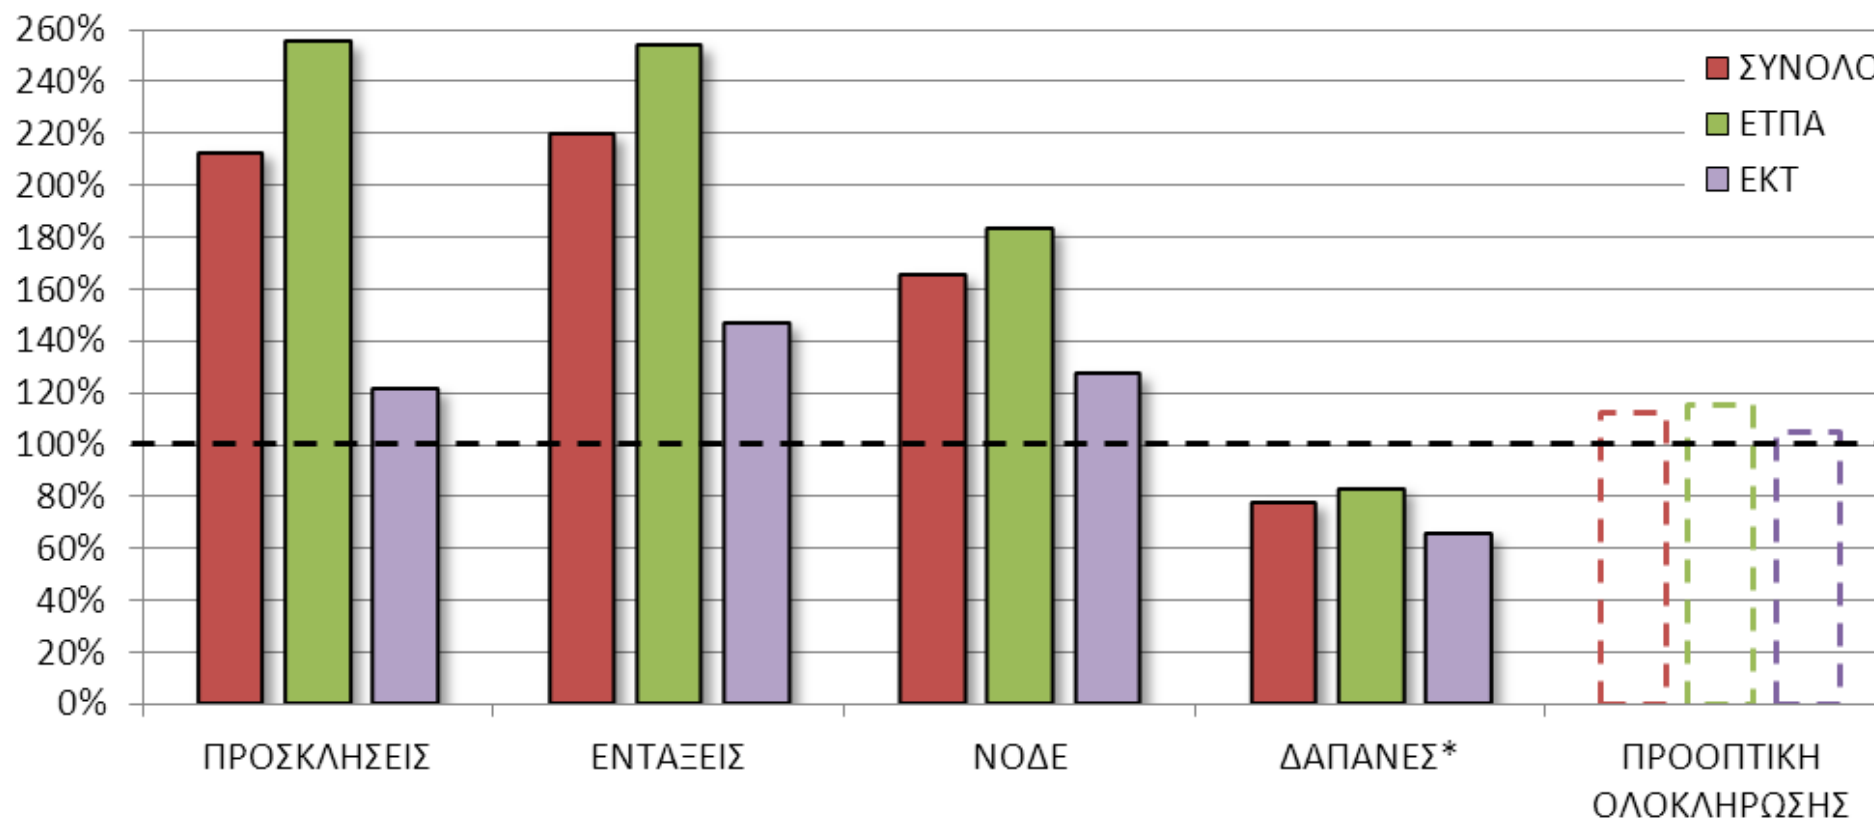


* Συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών υπό διοικητική επαλήθευση

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠ1

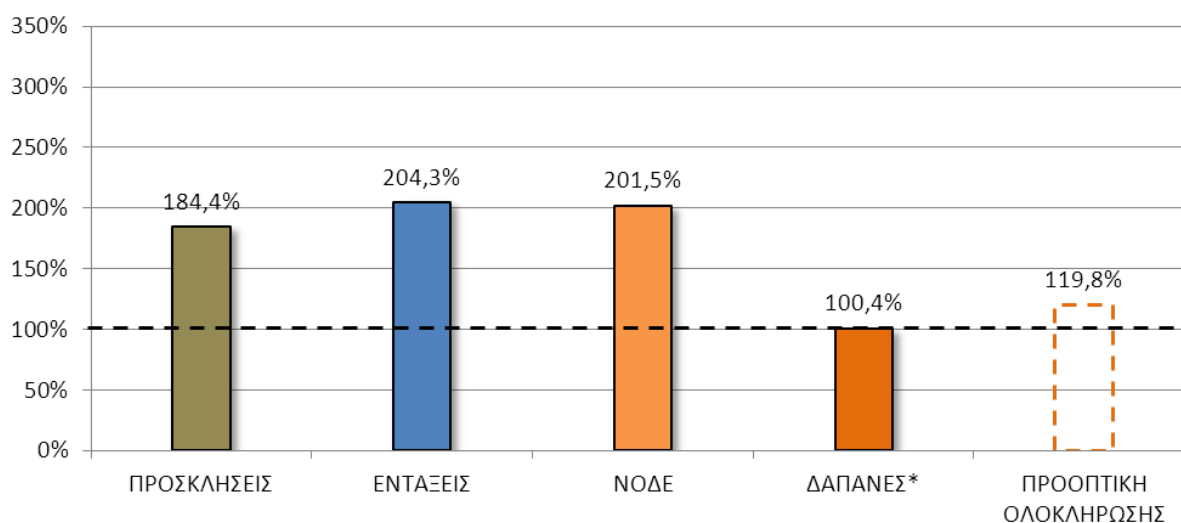


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠ2Α

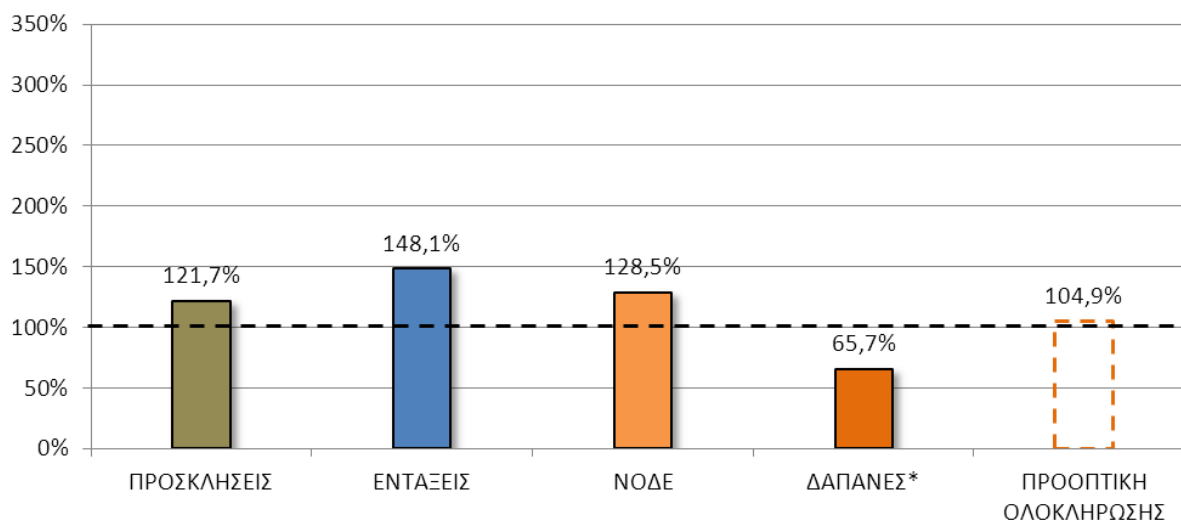

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠ2Β

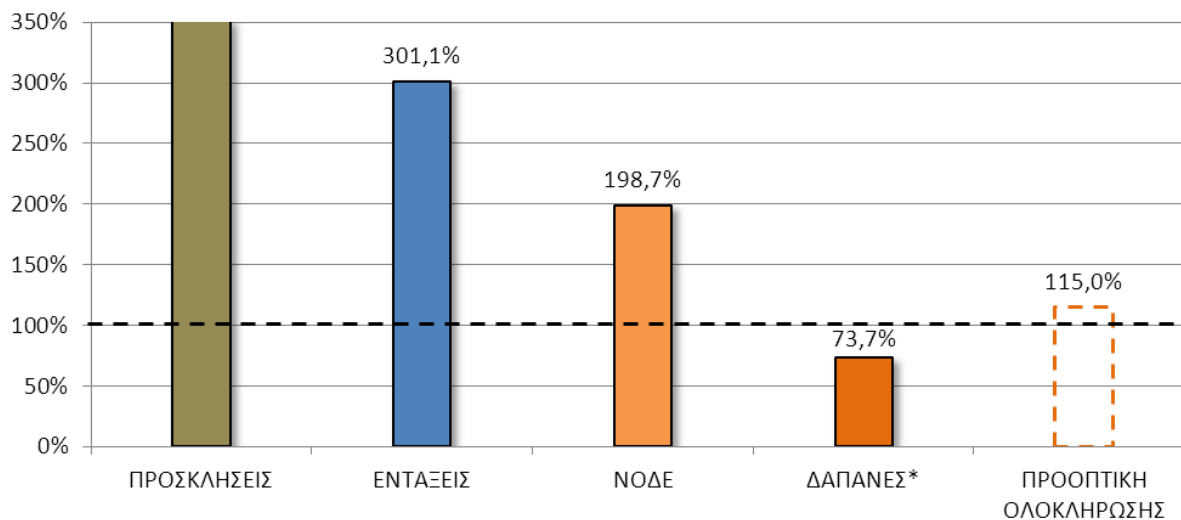


* Συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών υπό διοικητική επαλήθευση

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ3

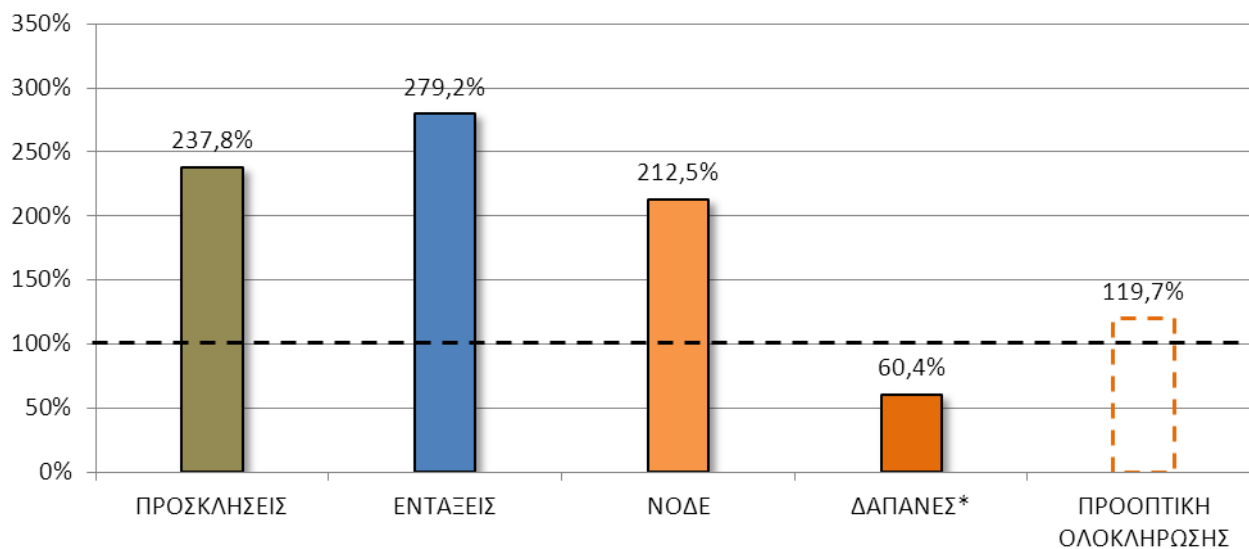


* Συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών υπό διοικητική επαλήθευση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ4

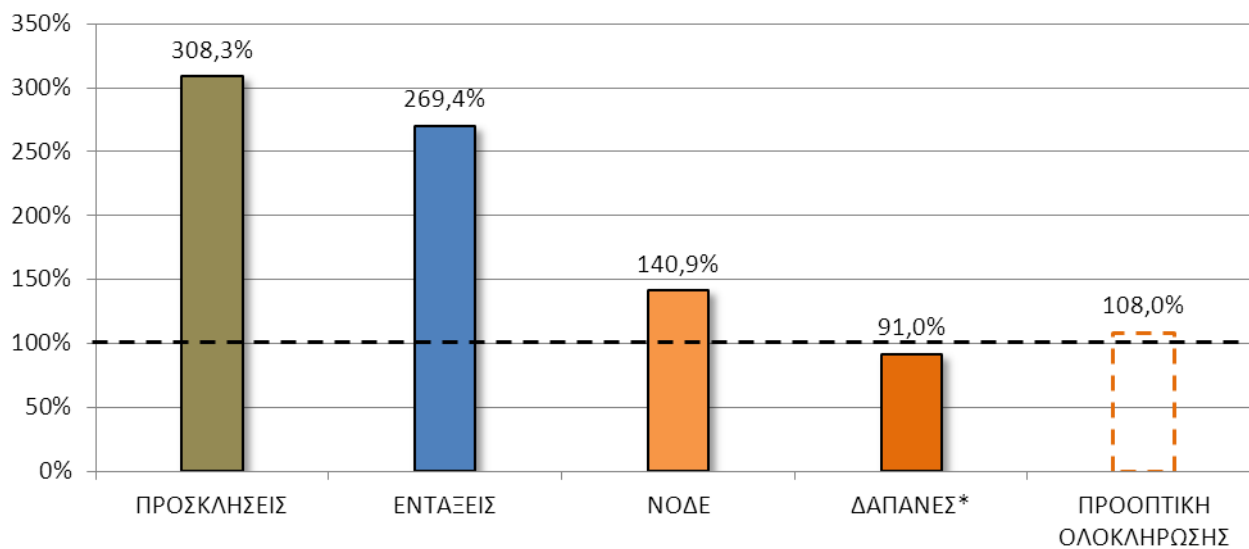


* Συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών υπό διοικητική επαλήθευση

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ5

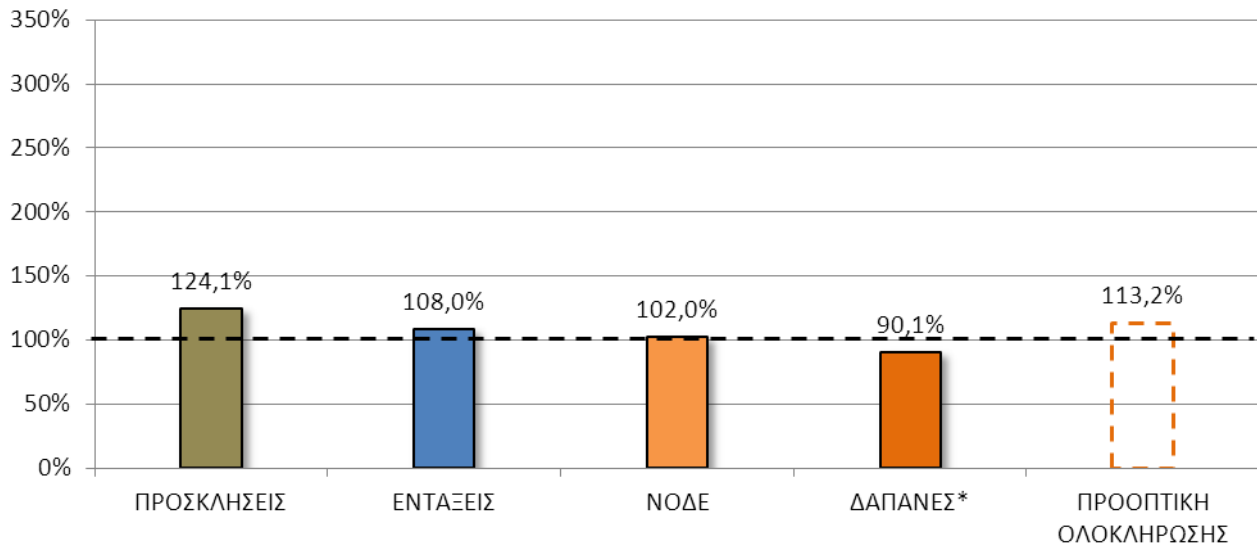


* Συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών υπό διοικητική επαλήθευση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.7

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ6

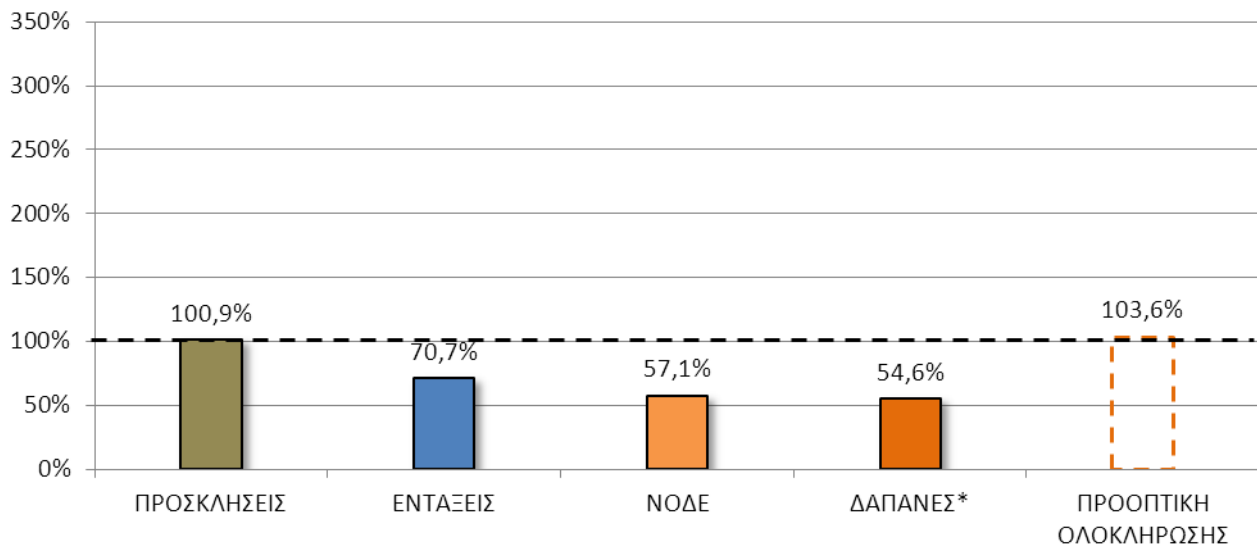


* Συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών υπό διοικητική επαλήθευση

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

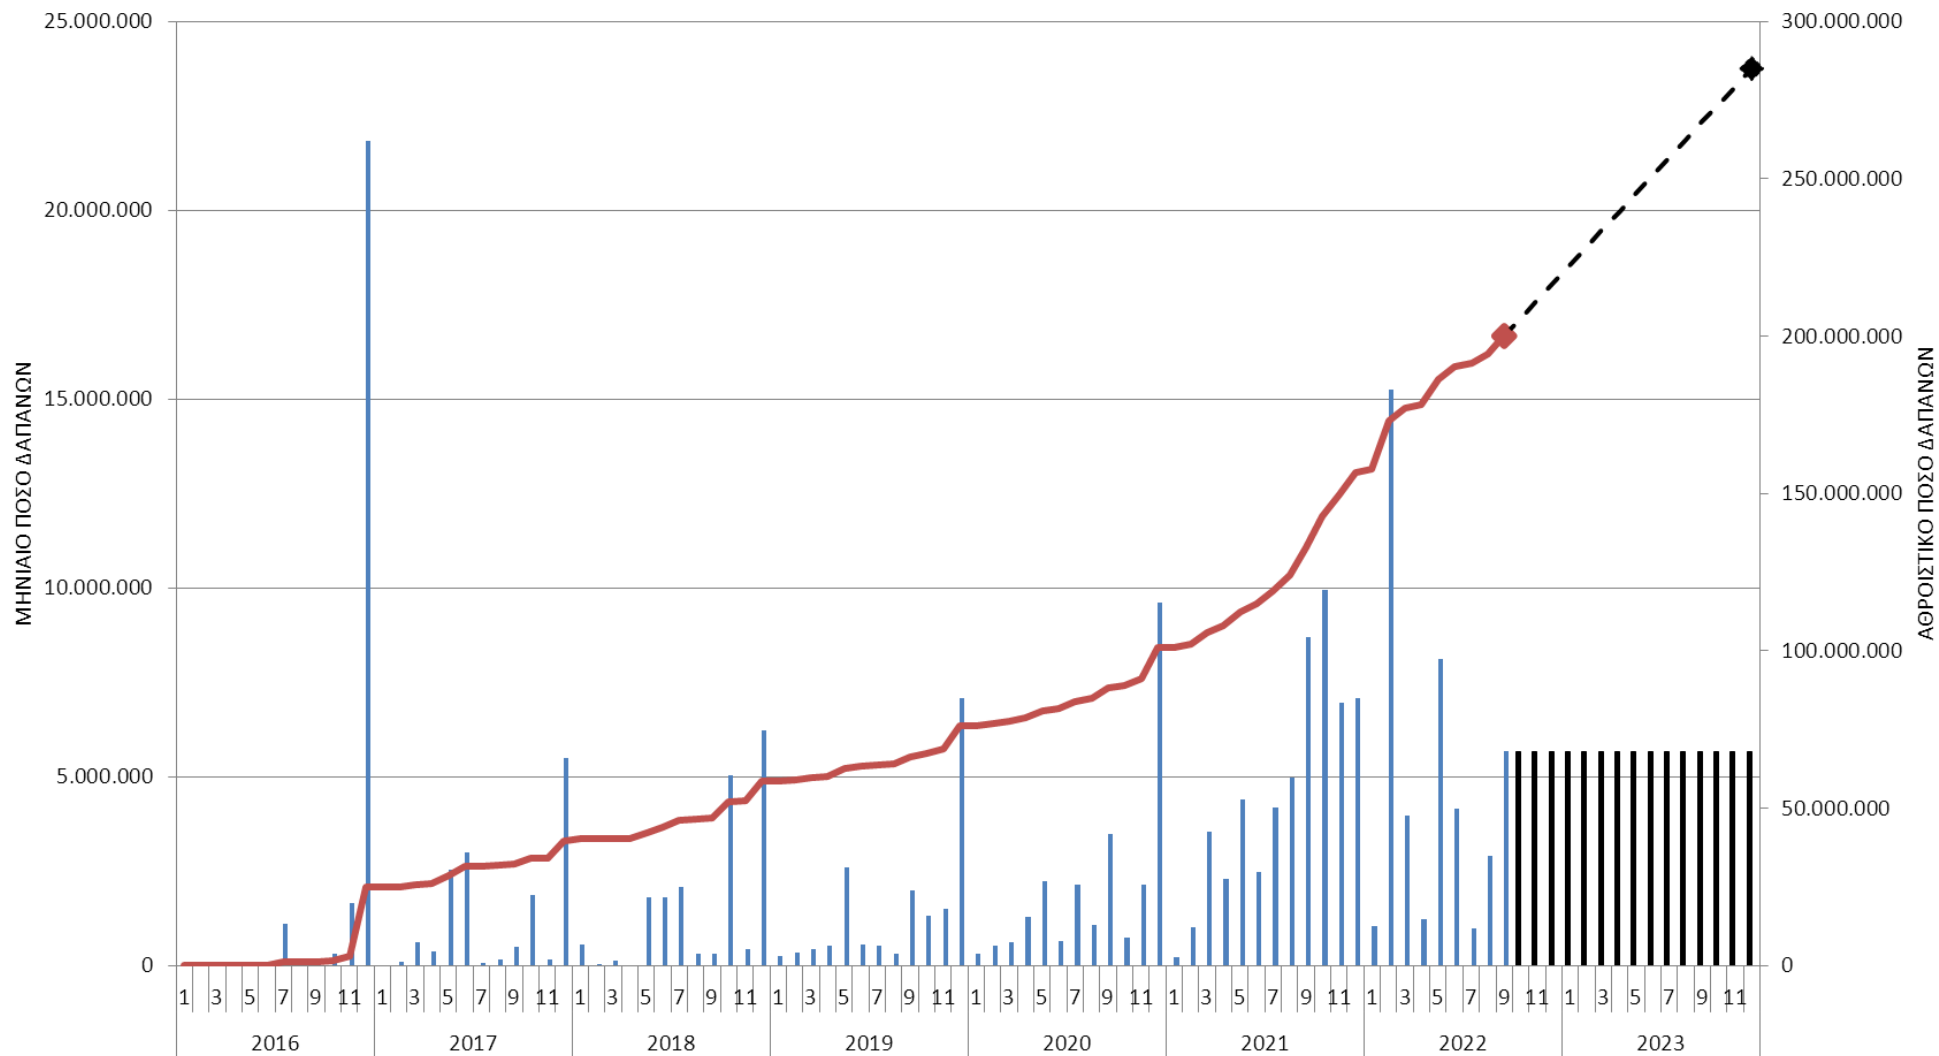


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΤΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

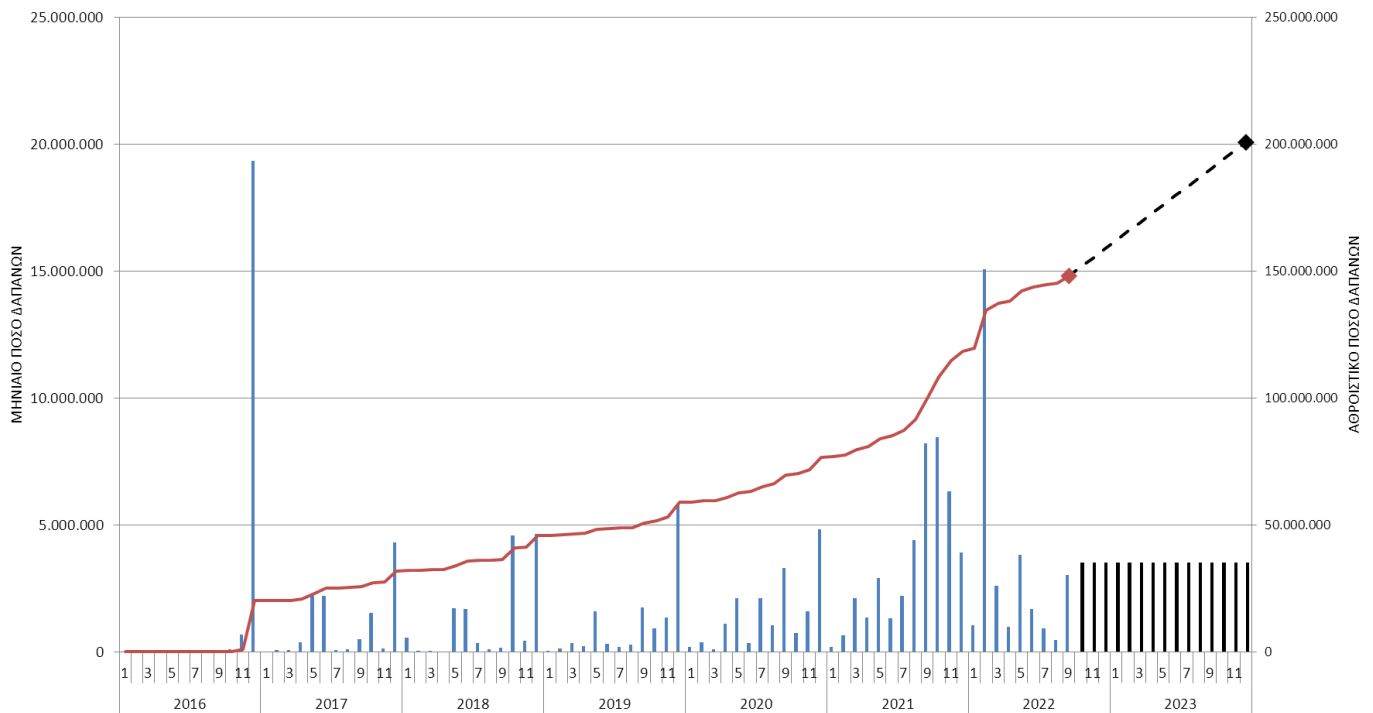


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΚΤ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

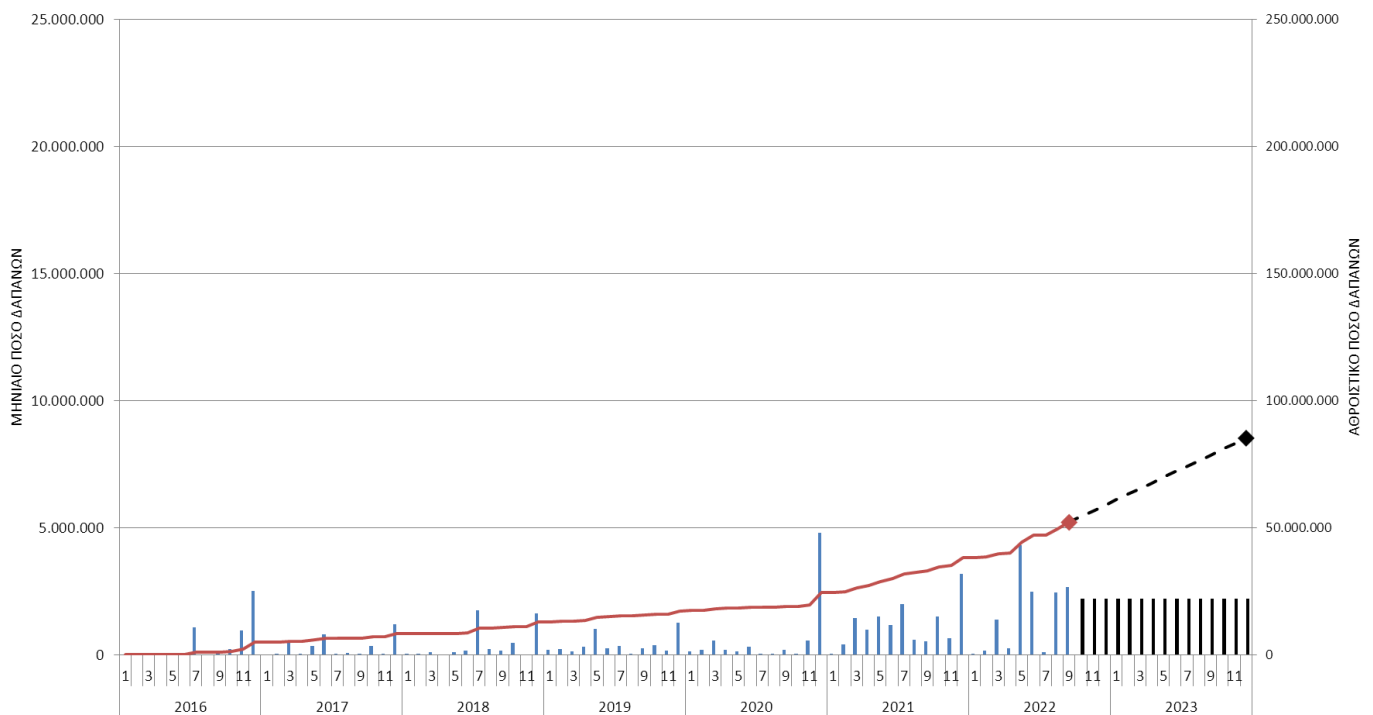


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

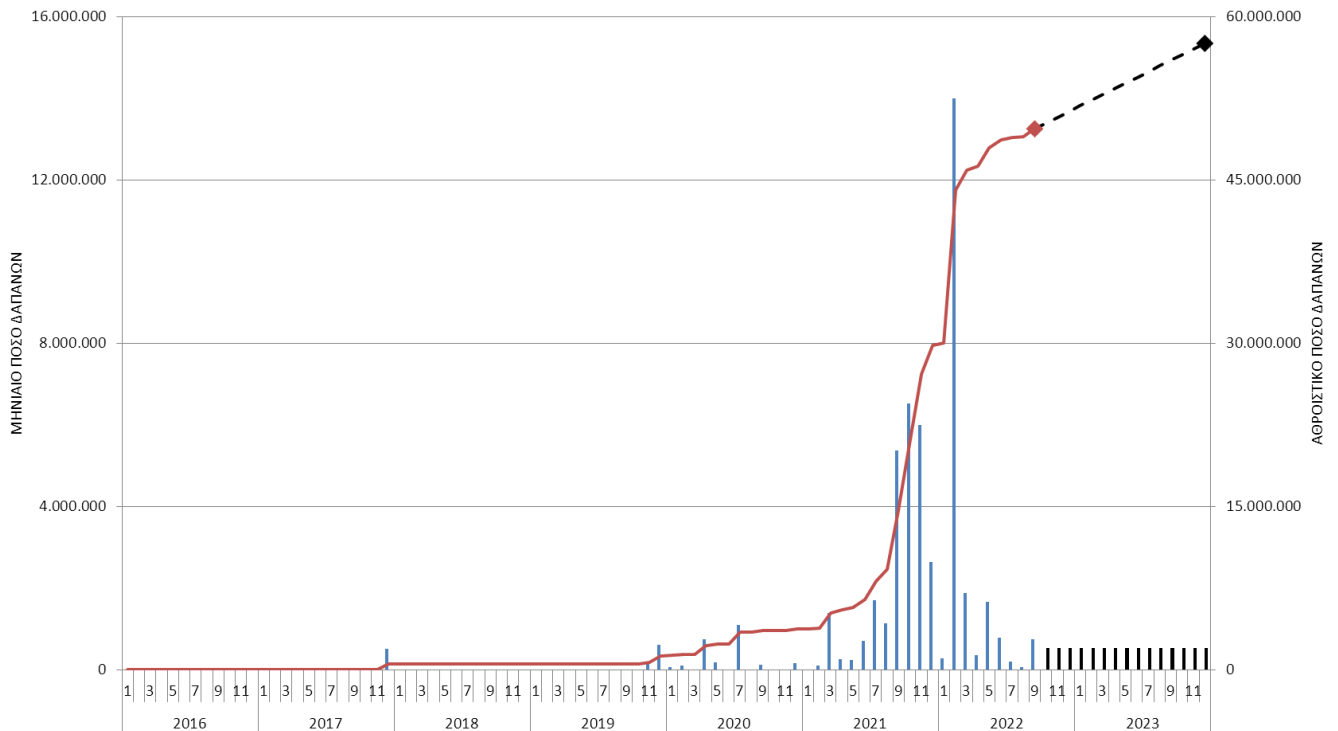


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ2Β


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

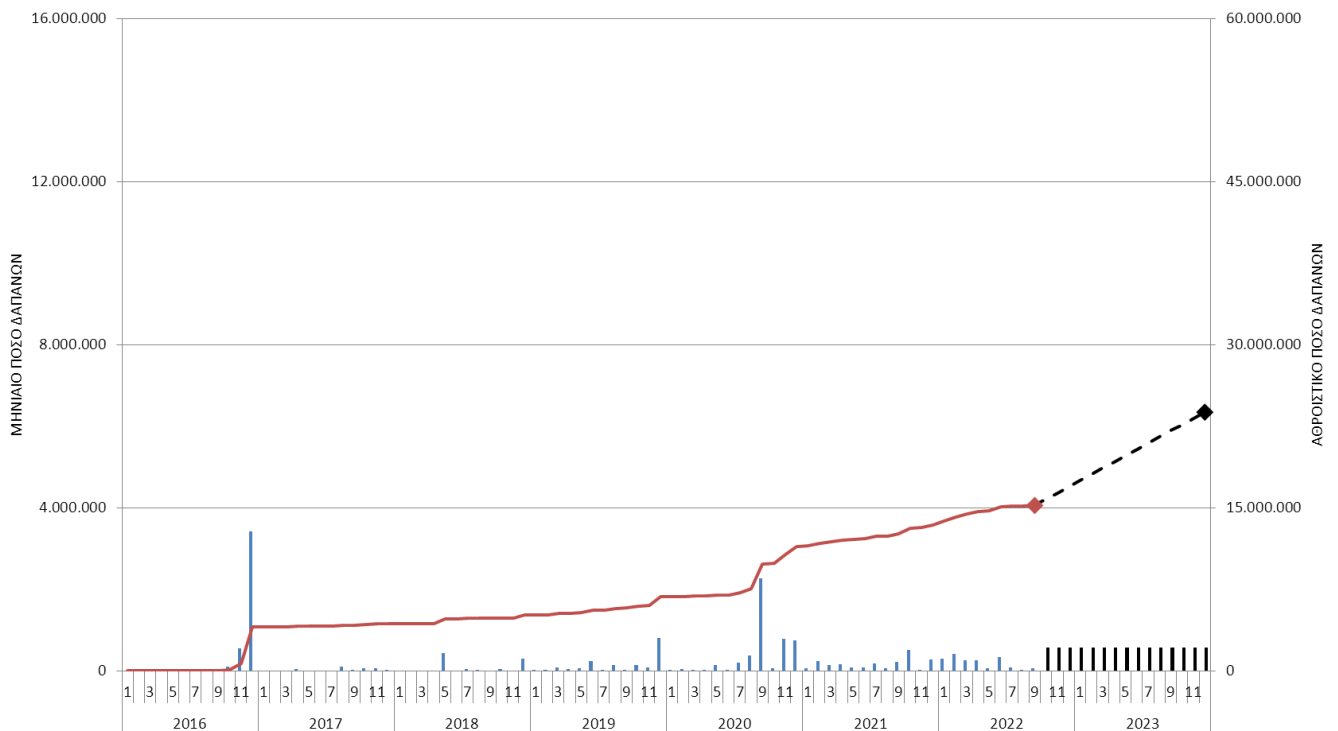

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ2Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

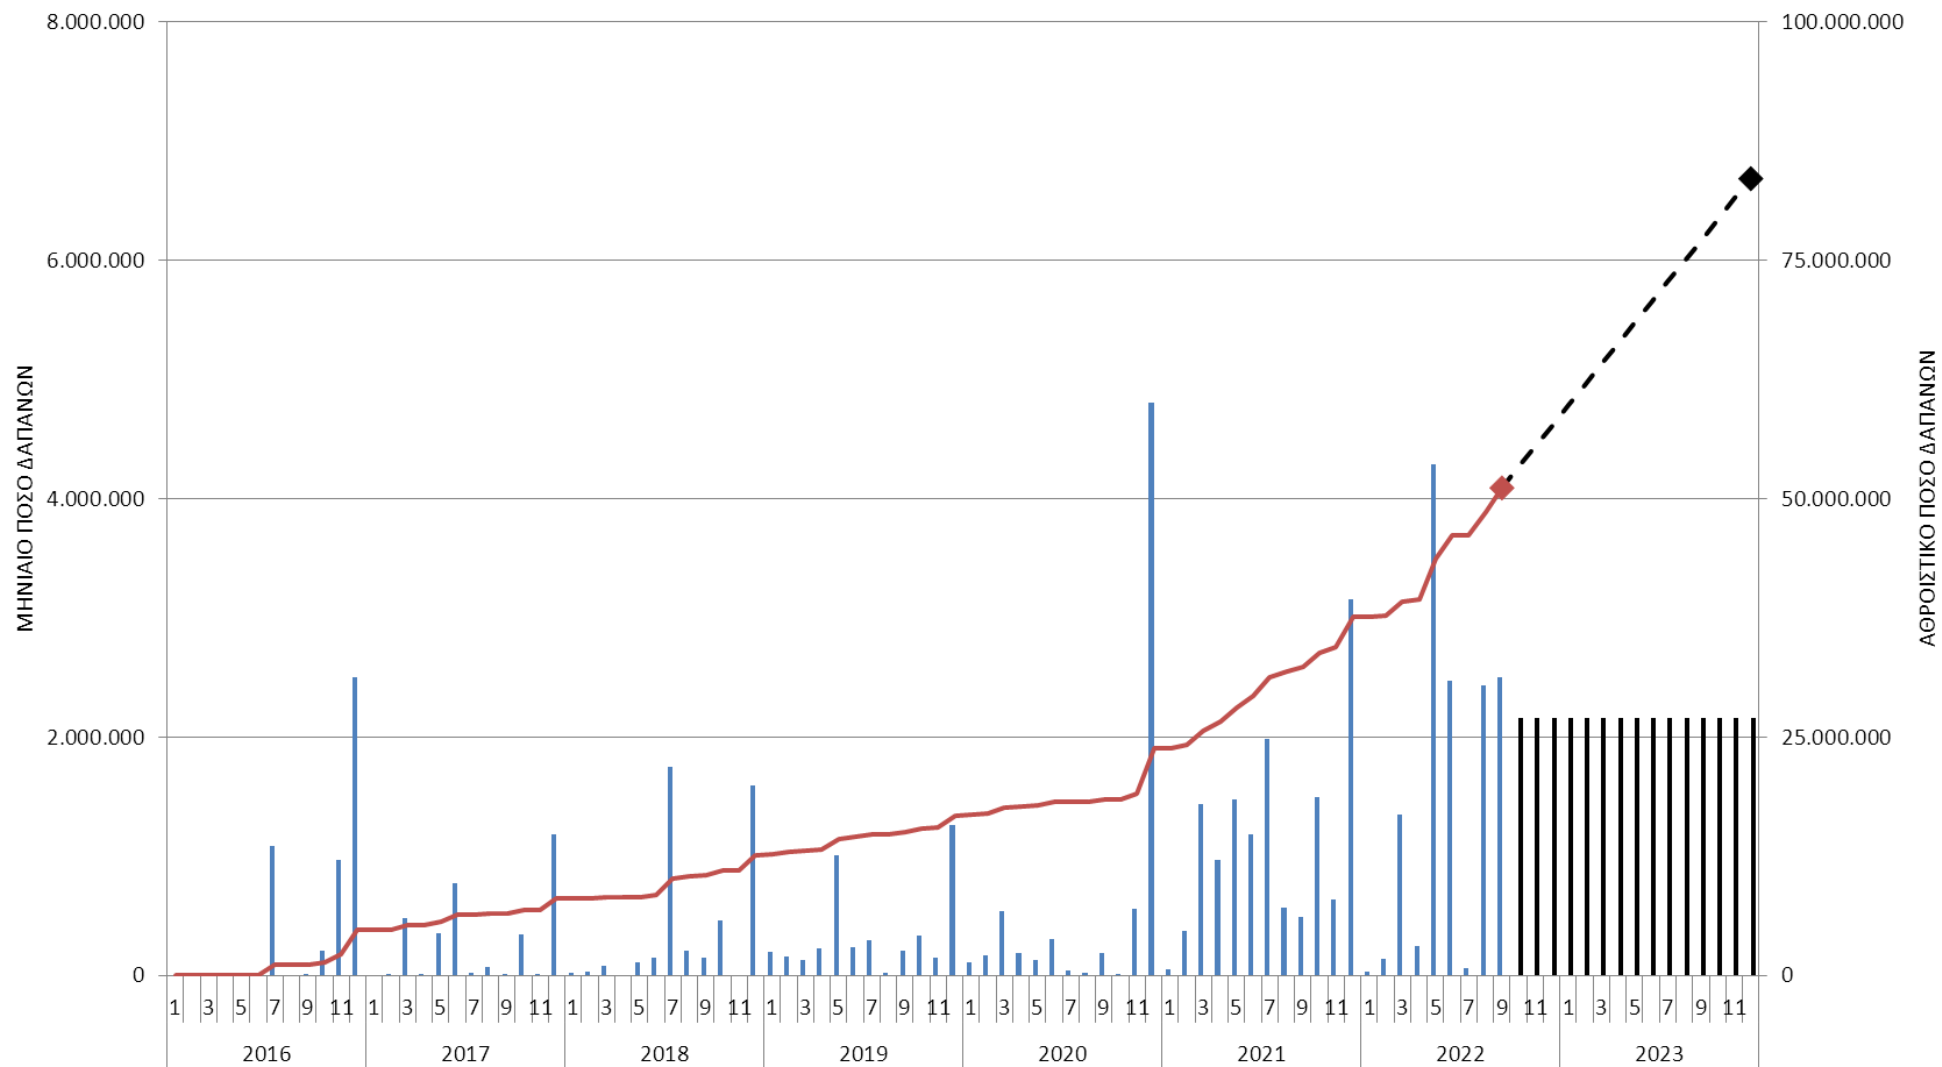


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

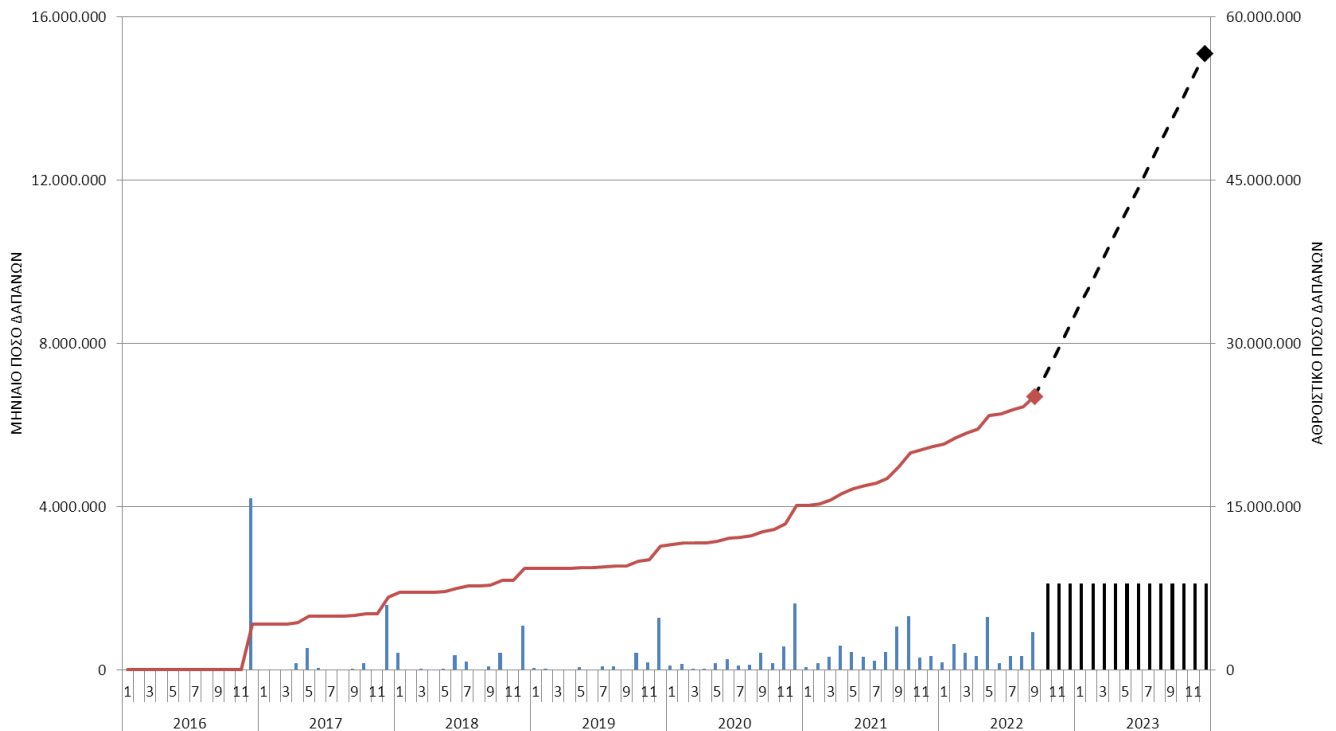


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

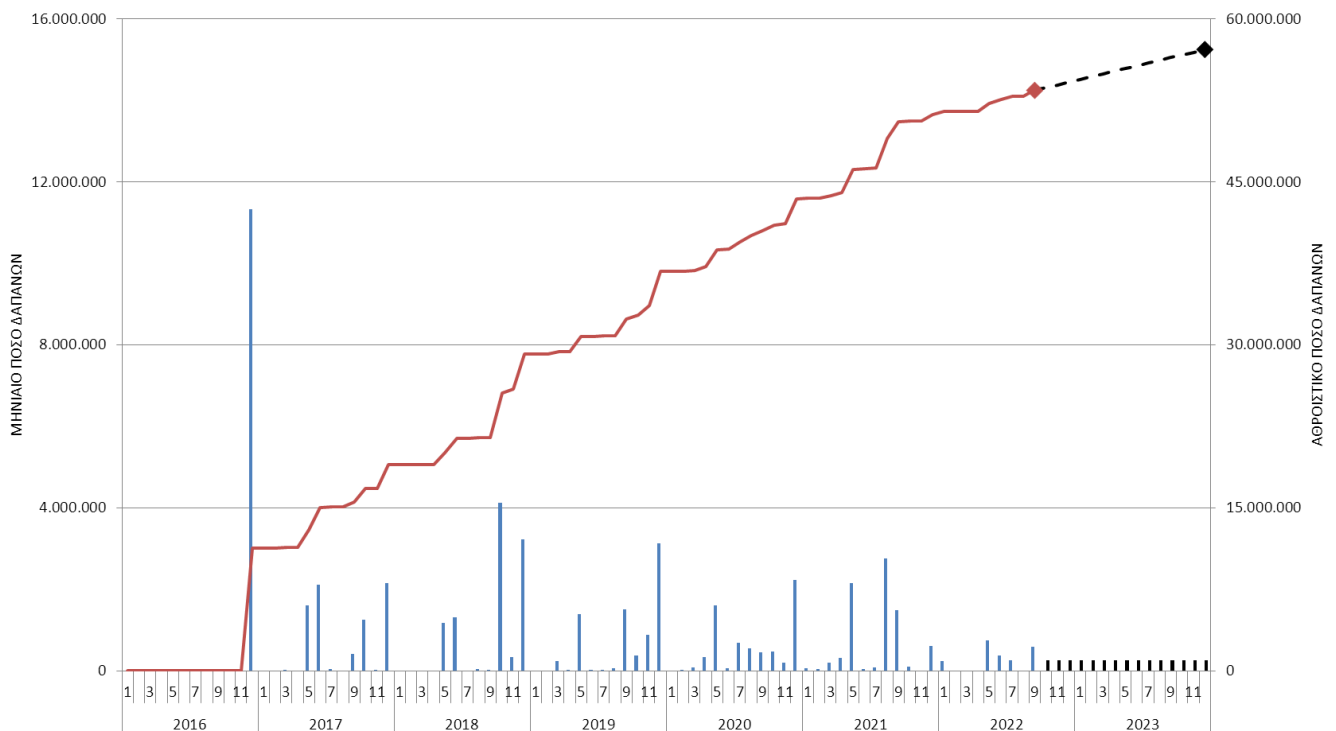


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

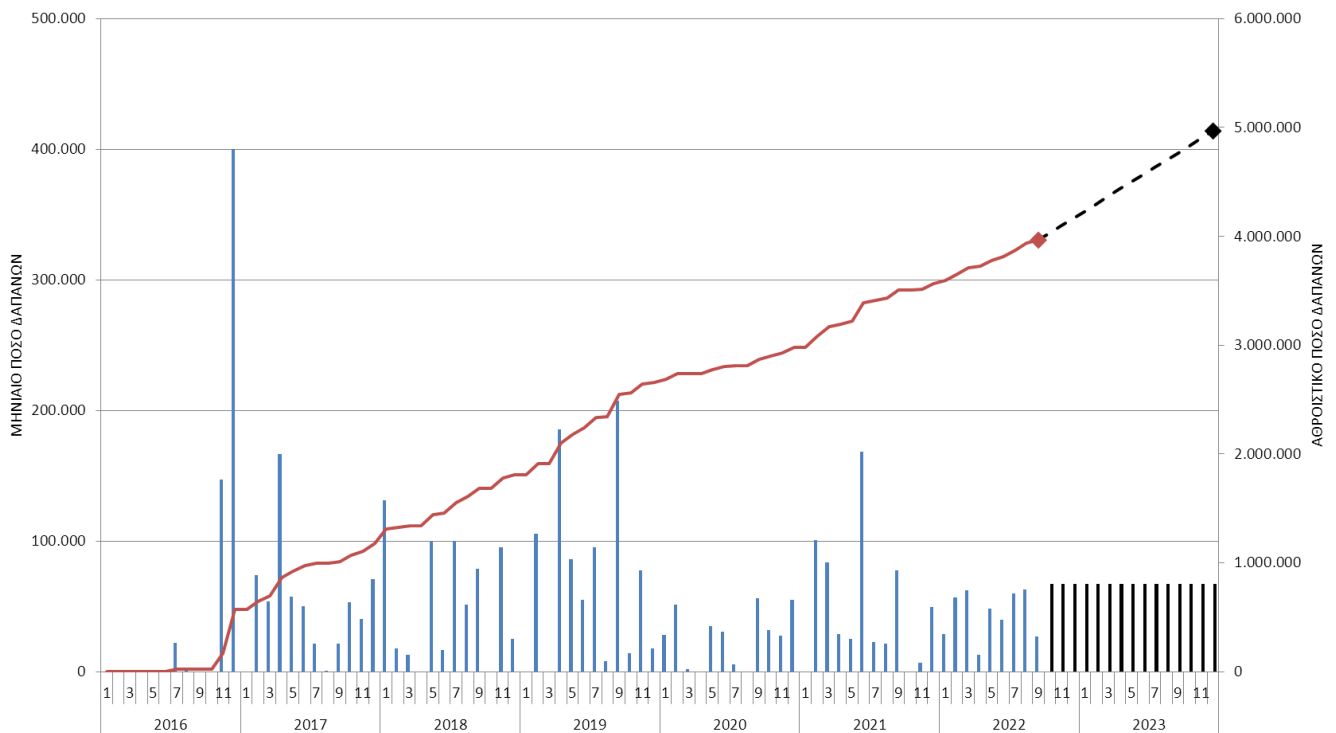


ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΣΤΟΧΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠ6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ: 30/9/2022

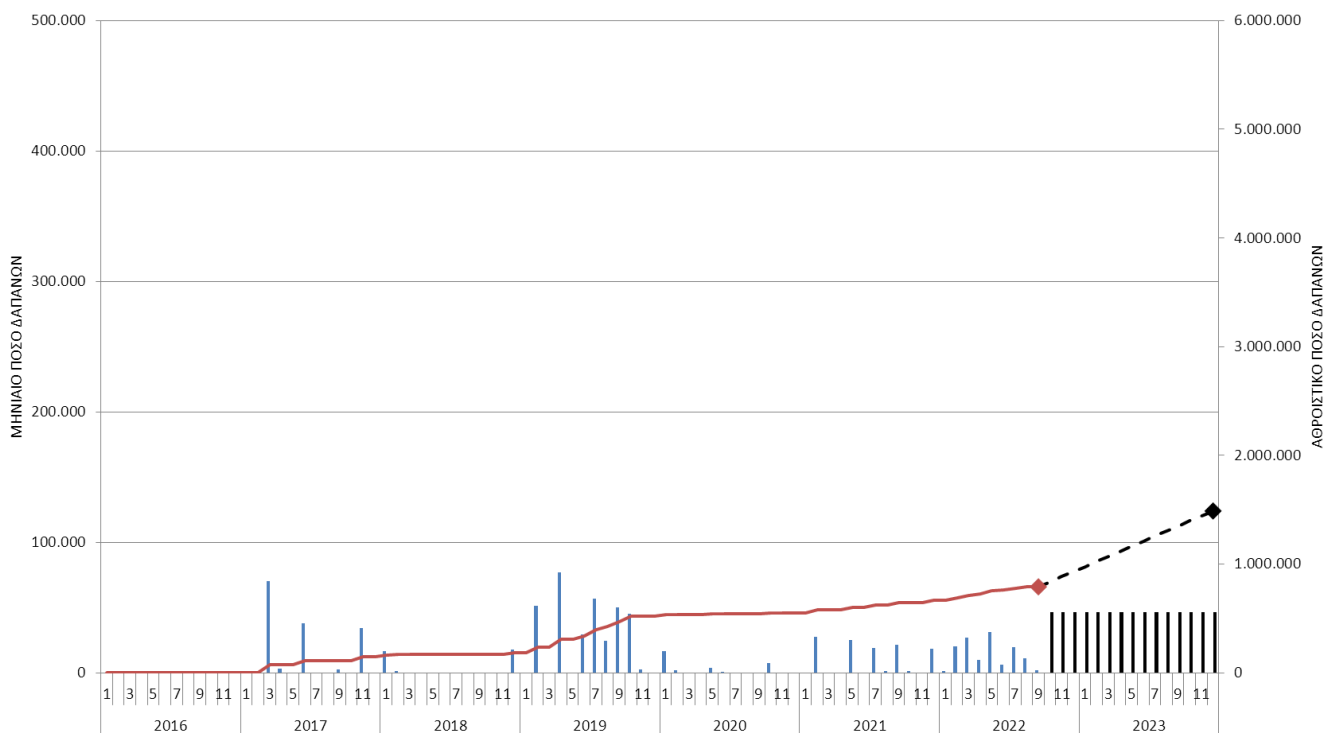

OP "PELOPONNISOS" 2014-2020

Table 4

EU contribution in the payment application submitted to meet N+3 target

OP PELOPONNISOS	Financing Plan		N+3 target		Cumulative amount of the pre- financing	EU contribution in the payment application (included top-up until 30/9/2022)	EU contribution in the payment application submitted to meet N+3 target	Public expenditures (EU Contribution + National) to be paid to meet N+3 target
year	Total allocation of the OP	Main allocation of the OP	Years in the Financing Plan	Cumulative amount of the main allocation				
2014	32.250.351	30.271.150			3.045.027,08			
2015	31.594.113	29.655.241			13.195.117,33			
2016	31.255.093	29.337.045			26.390.234,65			
2017	32.919.330	30.899.104	2014	30.271.150	31.719.032,03			
2018	32.994.674	30.969.822	up to 2015	59.926.391	37.594.314,11			
2019	33.298.395	31.254.906	up to 2016	89.263.436	43.736.654,46			
2020	9.612.309	9.021.950	up to 2017	120.162.540	50.146.053,09			
2021			up to 2018	151.132.362	54.224.538,39			
2022			up to 2019	182.387.268	58.303.023,69	154.291.925,65	-30.207.681,34	-37.759.601,67

Calculation of the annual instalments of the pre-financing

year	Initial pre- financing	Annual pre- financing	Additional initial pre-financing	Total pre- financing
2014	3.045.027,08	0,00	0,00	3.045.027,08
2015	3.045.027,08	0,00	7.105.063,18	10.150.090,25
2016	2.030.018,05	4.060.036,10	7.105.063,18	13.195.117,33
2017	0,00	5.328.797,38	0,00	5.328.797,38
2018	0,00	5.875.282,08	0,00	5.875.282,08
2019	0,00	6.142.340,35	0,00	6.142.340,35
2020	0,00	6.409.398,63	0,00	6.409.398,63
2021	0,00	4.078.485,30	0,00	4.078.485,30
2022	0,00	4.078.485,30	0,00	4.078.485,30
TOTAL	8.120.072,20	35.972.825,14	14.210.126,35	58.303.023,69

<i>Initial pre-financing</i>	
2014-2016	1,500%
<i>Annual pre-financing</i>	
2016	2,000%
2017	2,625%
2018	2,750%
2019	2,875%
2020	3,000%
2021-2023	2,000%
<i>Additional initial pre-financing</i>	
2015-2016	3,500%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΑΠ	ΕΠ.ΠΡΟΤ.	Τύπος Δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Ταμείο	Τελικός στόχος (2023)	Τιμή επίτευξης 2021 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021)	%	Τιμή στόχος των ενταγμένων έργων 30/9/2022	%	Τιμή στόχος των ενταγμένων έργων που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο 30/9/2022	%
1		F	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	ΕΤΠΑ	48.000.000,00	29.763.628,01	62,0%	47.937.498,63	99,9%	47.937.498,63	99,9%
1	3a, 3c	O	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	1.645,00	1.598,00	97,1%	2.147,00	130,5%	2.063,00	125,4%
2A		F	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	ΕΚΤ	79.572.690,00	36.872.007,89	46,3%	45.025.890,21	56,6%	45.025.890,21	56,6%
2A	9ii, 9iii, 9iv	O	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	Αριθμός	ΕΚΤ	14,00	14,00	100,0%	19,00	135,7%	16,00	114,3%
2A	9iv	O	11203	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν	Αριθμός	ΕΚΤ	9,00	8,00	88,9%	17,00	188,9%	17,00	188,9%
2A	9iv	O	CV33	Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19	Οντότητες	ΕΚΤ	13,00	21,00	161,5%	41,00	315,4%	41,00	315,4%
2A	9i, 9iii	O	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός	ΕΚΤ	14.400,00	16.148,00	112,1%	16.148,00	112,1%	16.148,00	112,1%
2A	9iii	O	11501	Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	Αριθμός	ΕΚΤ	270,00	319,00	118,1%	364,00	134,8%	364,00	134,8%
2B		F	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	ΕΤΠΑ	20.700.000,00	13.356.454,10	64,5%	14.838.013,41	71,7%	14.838.013,41	71,7%
2B	10a	O	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	ΕΤΠΑ	1.500,00	700,00	46,7%	1.815,00	121,0%	1.440,00	96,0%
2B	9a	O	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	ΕΤΠΑ	420.000,00	345.264,00	82,2%	577.903,00	137,6%	432.057,00	102,9%
3		F	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	ΕΤΠΑ	47.800.000,00	20.237.757,90	42,3%	23.319.196,77	48,8%	23.319.196,77	48,8%
3	6c	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος	ΕΤΠΑ	60.000,00	6.000,00	10,0%	150.829,00	251,4%	66.422,00	110,7%
3	6b	O	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	ΕΤΠΑ	65.000,00	12.294,00	18,9%	132.575,00	204,0%	62.355,00	95,9%
4		F	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	EURO	ΕΤΠΑ	52.966.553,00	49.842.320,71	94,1%	49.446.639,96	93,4%	49.446.639,96	93,4%
4	7b	O	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	ΕΤΠΑ	12,00	10,37	86,4%	26,35	219,6%	11,22	93,5%
4	7b	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	ΕΤΠΑ	22,00	7,34	33,4%	51,34	233,4%	14,06	63,9%
